



Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Aug	Sep	4. Qtl
1			DL Osterode & Osterode-Leege - Rahmentermine Ausführung	284 Tage	Die 01.12.26	Fre 31.12.27			
2			Leistungsbeginn BauAN, Auftaktgespräch	0 Tage	Die 01.12.26	Die 01.12.26			
3			Rückschnitte & Baufeldfreimachung	20 Tage	Mon 01.02.27	Fre 26.02.27			
4			Abgabe prüffähige AP	0 Tage	Mon 22.02.27	Mon 22.02.27			
5			Materialisierung Stahlrohr	80 Tage	Mon 17.05.27	Fre 03.09.27			
6			Baubeginn, BE-Flächen Einrichtung, Beweissicherung, Vermessung, Kabelsicherung	20 Tage	Mon 16.08.27	Fre 10.09.27			
7			Sperrzeit - 17.09.27- 22 Uhr bis 21.09.27 - 5 Uhr	3 Tage	Fre 17.09.27	Die 21.09.27			
8			IBN nach VV Bau (km 107,621)	0 Tage	Die 21.09.27	Die 21.09.27			
9			IBN nach VV Bau (km 108,370)	0 Tage	Fre 15.10.27	Fre 15.10.27			
10			Mängelbeseitigung, Restarbeiten & Rückbau der BE-Flächen	15 Tage	Mon 18.10.27	Fre 05.11.27			
11			DUA / Belastungsstopfgang - 0 bis 6 Uhr	1 Tag	Sam 20.11.27	Sam 20.11.27			
12			Bestandsdokumentation	40 Tage	Mon 08.11.27	Fre 31.12.27			
13			Fertigstellung der Ausführungsleistung	0 Tage	Fre 31.12.27	Fre 31.12.27			

Projekt: Rahmentermine Ausfü
Datum: Fre 28.08.26

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

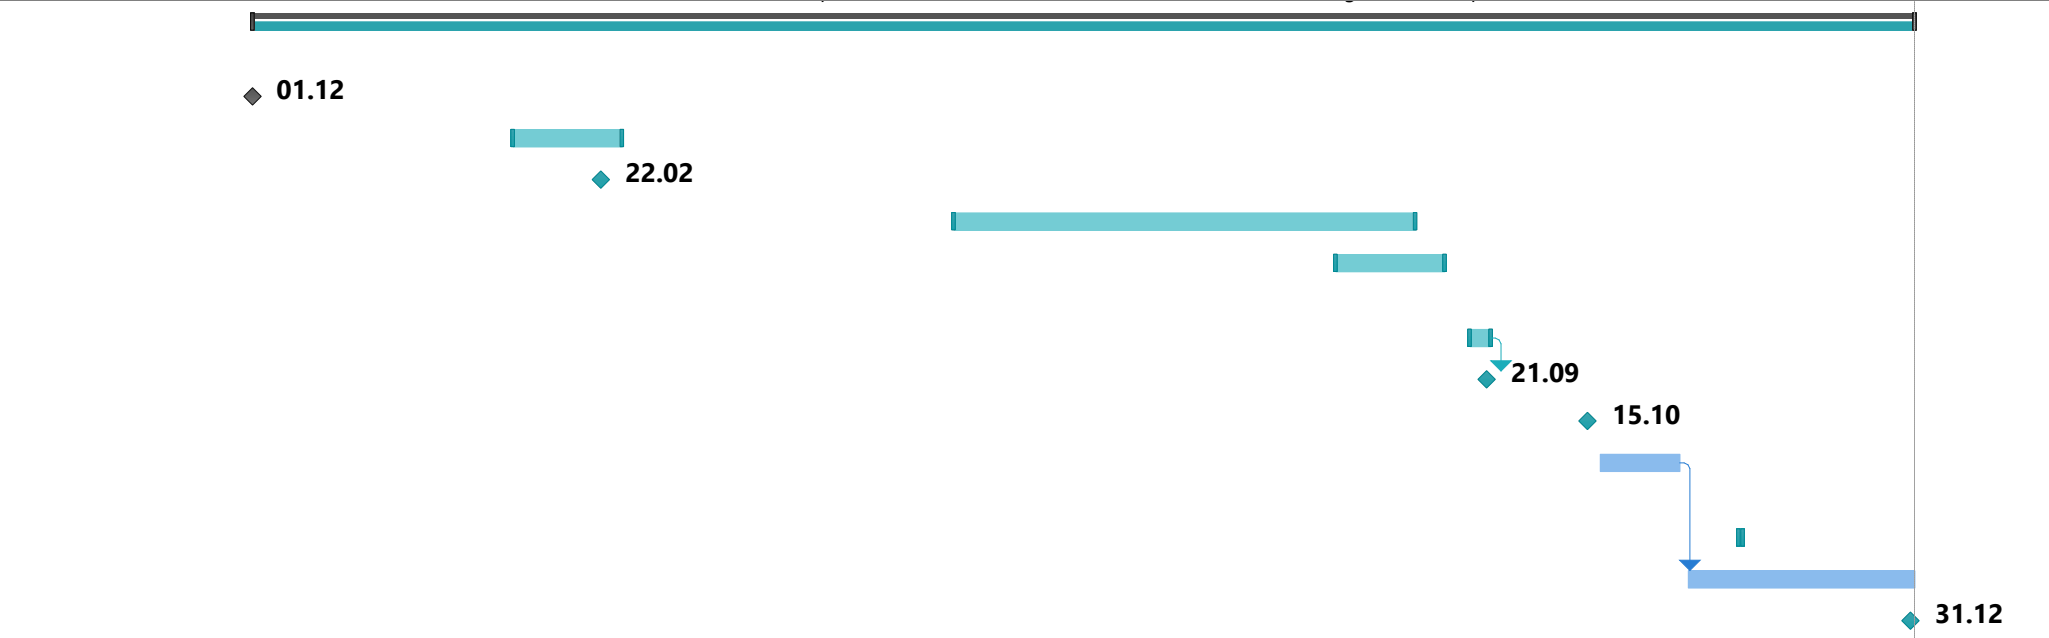

Projekt: Rahmentermine Ausfü Datum: Fre 28.08.26	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			
