

Standardterminplan Durchlässe PRO2020

Nr.	Gliederung	VORGANG	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	%	BW
0	0		Terminplan Hangsicherung G016266137 km 45,880-45,955	2372 Tage	Fre 29.04.22	Die 03.06.31	0%	
1	1		Projektvorbereitungsphase	1130 Tage	Fre 29.04.22	Don 27.08.26	0%	
2	1.1		Projektdefinition	1130 Tage	Fre 29.04.22	Don 27.08.26	0%	
3	1.1.1		Projektdefinition abgeschlossen / Projekt kaufmännisch angelegt	0 Tage	Fre 29.04.22	Fre 29.04.22	0%	
4	1.1.2		Wartezeit (Mifri-Stabilisierung)	1130 Tage	Fre 29.04.22	Don 27.08.26	0%	
5	1.2		Aufgabenstellung und Grundlagenermittlung	1119 Tage	Mon 16.05.22	Don 27.08.26	0%	
6	1.2.1		terminierter Projektstart	0 Tage	Don 27.08.26	Don 27.08.26	0%	
7	1.2.2	1.40.200	Mittelfreigabe zur Lph 1/2 (ggf. bis 7) erfolgt	0 Tage	Mon 16.05.22	Mon 16.05.22	0%	BP-MS
8	1.2.3		BAst erstellen und genehmigen	135 Tage	Mit 18.05.22	Die 22.11.22	0%	
9	1.2.4		integriertes Team gebildet	0 Tage	Die 19.07.22	Die 19.07.22	0%	
10	1.2.5	1.10.100	BAst ist genehmigt	0 Tage	Die 22.11.22	Die 22.11.22	0%	BP-MS
11	1.3		Projektübernahme und Aufsatz	16 Tage	Mon 30.05.22	Mon 20.06.22	0%	
12	1.3.1	1.40.300	QualityGate Vorplanungsbeginn (VB)	0 Tage	Mon 30.05.22	Mon 30.05.22	0%	BP-MS
13	1.3.2	1.30.060	Projektübergabe erfolgt	0 Tage	Die 07.06.22	Die 07.06.22	0%	BP-MS
14	1.3.3		Projektaufsatz abgeschlossen	0 Tage	Mon 20.06.22	Mon 20.06.22	0%	
15	2		Vorplanung	515 Tage	Die 21.06.22	Mon 10.06.24	0%	
16	2.1		vorbereitenden Arbeiten Vorplanung durchführen (inkl. Vergabe Planungsleistungen Lph 2-4, optional 6/7)	14 Tage	Die 21.06.22	Fre 08.07.22	0%	
17	2.2	2.10.060	Vergabe Planungsleistungen Lph 2-4 (optional 6/7) abgeschlossen	0 Tage	Mon 20.03.23	Mon 20.03.23	0%	BP-MS
18	2.3		Vorplanung erstellen	143 Tage	Don 14.09.23	Mon 01.04.24	0%	
19	2.4		Vorplanung prüfen und Zustimmungen einholen	40 Tage	Die 02.04.24	Mon 27.05.24	0%	
20	2.5	2.20.080	Freigabe VP und Variantenentscheid sind erfolgt	0 Tage	Mon 27.05.24	Mon 27.05.24	0%	BP-MS
21	2.6		Planungsvereinbarung KrV abgeschlossen	0 Tage	Mon 27.05.24	Mon 27.05.24	0%	
22	2.7	2.60.300	QualityGate Abschluss Vorplanung (VP)	0 Tage	Mon 10.06.24	Mon 10.06.24	0%	BP-MS
23	3		Entwurfsplanung	246 Tage	Mon 01.04.24	Mon 10.03.25	0%	
24	3.1		Entwurfsplanung erstellen	110 Tage	Die 18.06.24	Mon 18.11.24	0%	
25	3.2		Abstimmung mit Kreuzungsbeteiligten und Leitungseigentümern	100 Tage	Die 22.10.24	Mon 10.03.25	0%	
26	3.3		Entwurfsplanung fertiggestellt und qualitätsgeprüft	0 Tage	Mon 18.11.24	Mon 18.11.24	0%	
27	3.4		Entwurfsplanung prüfen und Zustimmungen einholen	50 Tage	Die 19.11.24	Mon 27.01.25	0%	
28	3.5	3.10.070	Entwurfsplanung geprüft und zugestimmt	0 Tage	Mon 01.04.24	Mon 01.04.24	0%	BP-MS
29	3.6	3.10.300	QualityGate Abschluss Entwurfsplanung (EP)	0 Tage	Die 11.02.25	Die 11.02.25	0%	BP-MS


Standardterminplan Durchlässe PRO2020

Nr.	Gliederung	VORGANG	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	%	BW
30	4		Baubetriebsplanung (für Fahrplanwechsel n-3)	305 Tage	Die 29.02.28	Die 01.05.29	0%	
31	4.1		Mittelfristiges Kapazitätsmanagement (n-3) angemeldet	0 fTage	Die 29.02.28	Die 29.02.28	0%	
32	4.2		Konkretisierung und baubetriebliche Anmeldung Kapazitätsmanagement Fahren und Bauen hA-Netz (n-2) durchgeführt	0 fTage	Sam 30.09.28	Sam 30.09.28	0%	
33	4.3		Bestätigung und baubetriebliche Anmeldung Kapazitätsmanagement Fahren und Bauen hA- und mA-Netz (n-1) durchgeführt	0 fTage	Die 01.05.29	Die 01.05.29	0%	
34	4.4		Anmeldung zum Kapazitätskonfliktmanagement durchgeführt	0 fTage	Die 01.05.29	Die 01.05.29	0%	
35	5		Genehmigungsplanung	658 Tage	Mon 01.07.24	Mit 06.01.27	0%	
36	5.1		Planrechtsunterlagen erstellen	105 Tage	Don 08.08.24	Mit 01.01.25	0%	
37	5.2	3.30.050	Antrag zum Planrecht beim EBA eingereicht	0 Tage	Mon 01.07.24	Mon 01.07.24	0%	BP-MS
38	5.3		Eingangsprüfung durchführen und Verfahrensart festlegen	35 Tage	Mon 01.07.24	Fre 16.08.24	0%	
39	5.4		Planrechtsverfahren [händische Auswahl eines der nachfolgenden Verfahren, die anderen löschen]	620 Tage	Don 22.08.24	Mit 06.01.27	0%	
40	5.4.1		Planfeststellung AEG	620 Tage	Don 22.08.24	Mit 06.01.27	0%	
41	5.4.1.1		Anhörung / Auslegung	450 Tage	Don 22.08.24	Mit 13.05.26	0%	
42	5.4.1.2		Erörterungstermin Anhörungsbehörde	0 Tage	Mit 13.05.26	Mit 13.05.26	0%	
43	5.4.1.3		Anhörungsbericht liegt vor	0 Tage	Mit 10.06.26	Mit 10.06.26	0%	
44	5.4.1.4		EBA erstellt Planfeststellungsbeschluss	110 Tage	Don 06.08.26	Mit 06.01.27	0%	
45	5.4.1.5		Planfeststellungsbeschluss liegt vor	0 Tage	Mit 06.01.27	Mit 06.01.27	0%	
46	5.4.2		Plangenehmigung AEG	395 Tage	Don 22.08.24	Mit 25.02.26	0%	
47	5.4.2.1		Benehmensherstellung TÖB / Beteiligung Verbände	100 Tage	Don 22.08.24	Mit 08.01.25	0%	
48	5.4.2.2		Einwendungsbearbeitung durchführen	80 Tage	Don 09.01.25	Mit 30.04.25	0%	
49	5.4.2.3		alle Einwendungen berücksichtigt	0 Tage	Mit 30.04.25	Mit 30.04.25	0%	
50	5.4.2.4		EBA erstellt Plangenehmigung	215 Tage	Don 01.05.25	Mit 25.02.26	0%	
51	5.4.2.5		Plangenehmigung liegt vor	0 Tage	Mit 25.02.26	Mit 25.02.26	0%	
52	5.4.3		Entfallen von Planfeststellung und Plangenehmigung AEG	260 Tage	Don 22.08.24	Mit 20.08.25	0%	
53	5.4.4		ohne Planrecht	80 Tage	Don 22.08.24	Mit 11.12.24	0%	
54	5.5	3.30.110	Bestandskraft Planrecht	0 Tage	Mit 30.12.26	Mit 30.12.26	0%	BP-MS
55	5.6		ggf. Einarbeitung von Auflagen aus Planrecht	20 Tage	Mit 09.12.26	Die 05.01.27	0%	


Standardterminplan Durchlässe PRO2020

Nr.	Gliederung	VORGANG	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	%	BW
56	5.7	3.30.200	Abschluss EP/GP	0 Tage	Mit 30.12.26	Mit 30.12.26	0%	BP-MS
57	6		Finanzierung	15 Tage	Mit 23.12.26	Die 12.01.27	0%	
62	7		Ausschreibung und Vergabe	263 Tage	Don 14.05.26	Mon 17.05.27	0%	
70	8		Ausführungsplanung	70 Tage	Mon 03.05.27	Fre 06.08.27	0%	
74	9		Realisierung	97 Tage	Fre 15.10.27	Mon 28.02.28	0%	
75	9.1		Referenzierter Fahrplanwechsel (relevant für Anmeldung nach Ril 406) [Händisch eingeben]	0 fTage	Son 15.12.30	Son 15.12.30	0%	
76	9.2	6.20.010	Baubeginn erfolgt	80 Tage	Fre 15.10.27	Don 03.02.28	0%	BP-MS
77	9.3		Bau ausführen	41 Tage	Fre 15.10.27	Fre 10.12.27	0%	
78	9.4		Inbetriebnahme und Restarbeiten	5 Tage	Die 22.02.28	Mon 28.02.28	0%	
79	9.4.1		Abnahme durchführen	1 Tag	Mon 28.02.28	Mon 28.02.28	0%	
80	9.4.2	7.30.070	Inbetriebnahme erfolgt	0 Tage	Mon 28.02.28	Mon 28.02.28	0%	BP-MS
81	9.4.3		Beantragung Wechsel Referenztermin Planrückführung (wenn erforderlich)	0 Tage	Mon 28.02.28	Mon 28.02.28	0%	
82	9.4.4		Bestandsplanrückführung	126 Tage	Mon 28.02.28	Mon 21.08.28	0%	
83	9.4.5		Restarbeiten / Mängelbeseitigung durchführen	60 Tage	Mon 28.02.28	Fre 19.05.28	0%	
84	9.4.6	6.20.200	Abschluss der Bauarbeiten / Technische Fertigstellung ist erfolgt	0 Tage	Mit 31.05.28	Mit 31.05.28	0%	BP-MS
85	9.4.7		Letzte Abnahmeprüfung VOB / VOL erfolgt	0 Tage	Die 06.06.28	Die 06.06.28	0%	
86	10		Projektdokumentation und Projektabschluss	779 Tage	Mit 07.06.28	Die 03.06.31	0%	
87	10.1		Projektabschluss durchführen	520 Tage	Mit 07.06.28	Die 04.06.30	0%	
88	10.2	7.40.100	Übergabe fertiggestellte Anlage und Bauakte	0 Tage	Die 08.05.29	Die 08.05.29	0%	
89	10.3	7.40.070	PAM (Projektabschlussmeldung) erfolgt	0 Tage	Die 03.06.31	Die 03.06.31	0%	BP-MS

Standardterminplan Durchlässe PRO2020

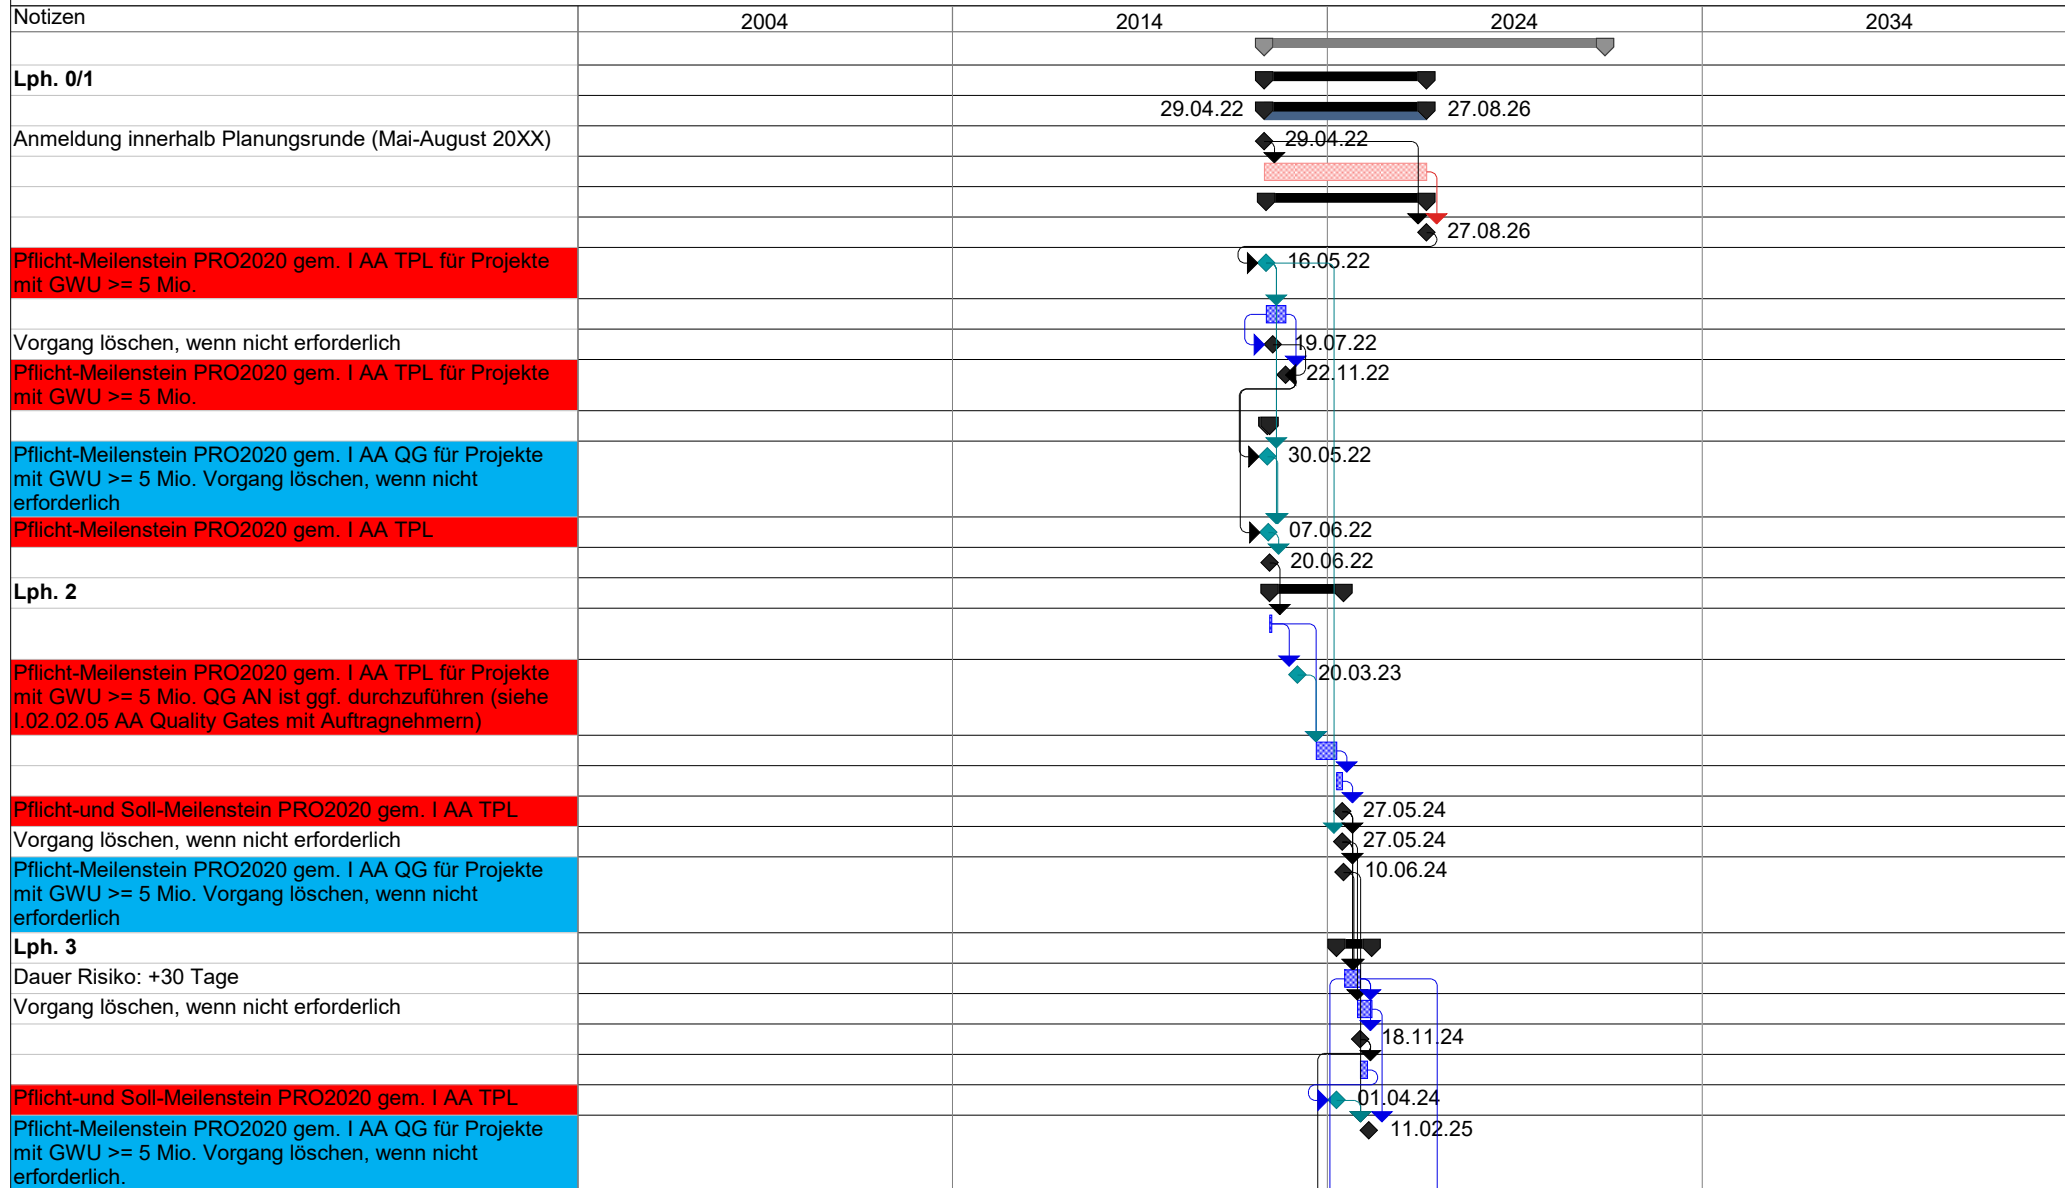

Standardterminplan Durchlässe PRO2020

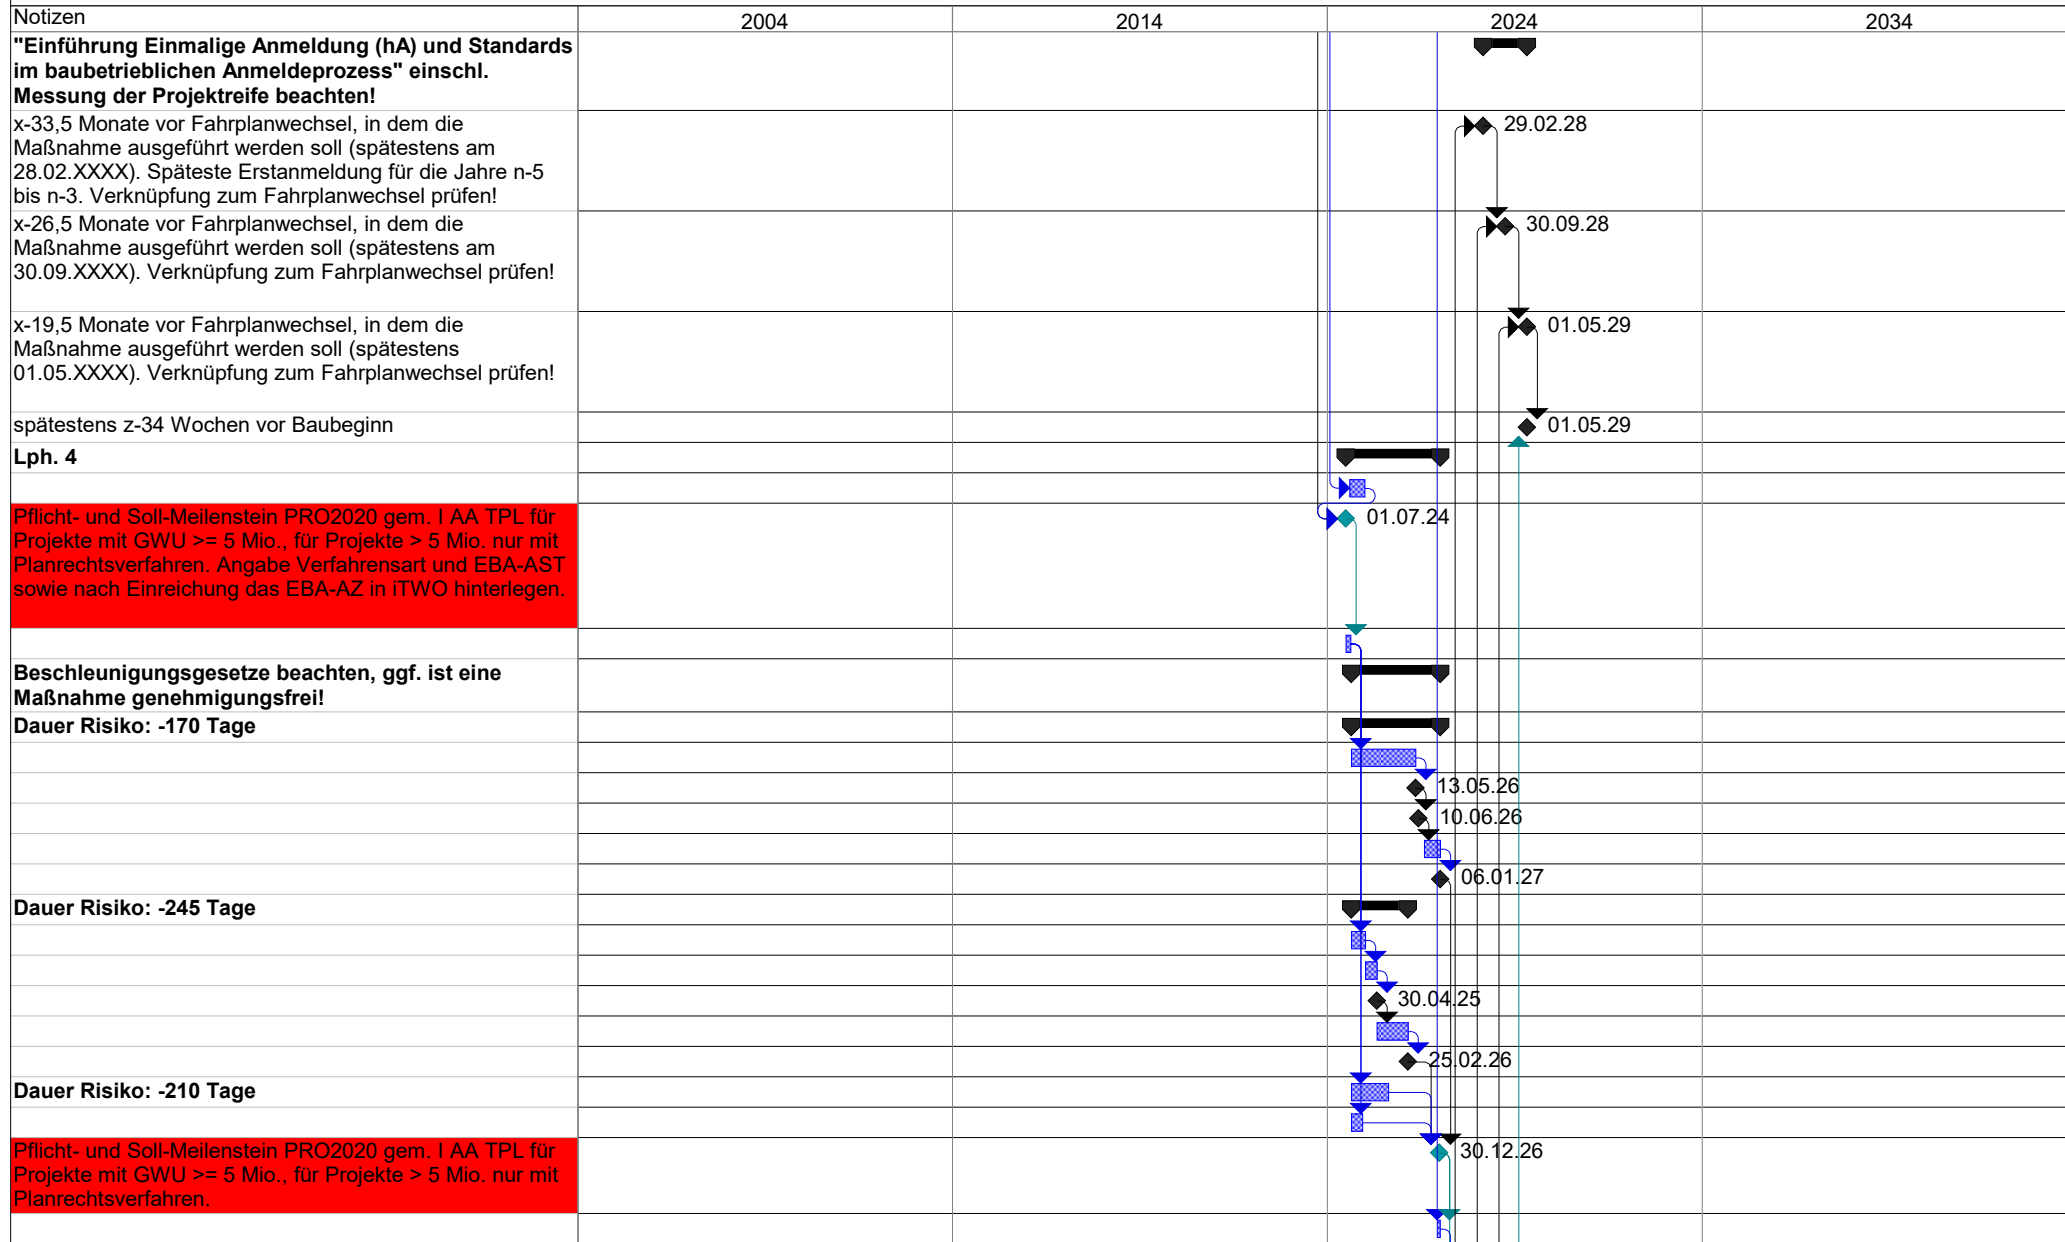

Standardterminplan Durchlässe PRO2020

Notizen	2004	2014	2024	2034
Pflicht-und Soll-Meilenstein PRO2020 gem. I AA TPL			30.12.26	
Lph. 6/7				
Lph. 5, gilt für das erste Gewerk, Arbeitsschritte sind für alle Planpakete zu durchlaufen			03.05.2706.08.27	
			15.10.2728.02.28	
Händisch eingeben!!! Im Anschluss sind die Termine Kapitel "Baubetriebsplanung (für Fahrplanwechsel n-3)" zu prüfen und ggf. anzupassen!			15.12.30	
Pflicht-und Soll-Meilenstein PRO2020 gem. I AA TPL			15.10.2703.02.28	
Projektindividuell. Dauer Risiko: +15 Tage.			22.02.2828.02.28	
			28.02.28	
Pflicht-und Soll-Meilenstein PRO2020 gem. I AA TPL			28.02.28	
			31.05.28	
Anpassung gemäß Projekterfordernis			06.06.28	
Pflicht-Meilenstein PRO2020 gem. I AA TPL für Projekte mit GWU >= 5 Mio. Anpassung gemäß Projekterfordernis und Vorgaben zum Beginn der Planrückführung Bestandspläne (bis zu 12 Monate nach IBN) beachten!			08.05.29	
			03.06.31	
Dauer Risiko: +220 Tage				
Optionaler Pflicht-Meilenstein PRO2020 gem. I AA TPL				
Pflicht-Meilenstein PRO2020 gem. I AA TPL				
