

CRB GmbH // Postfach 1154 // 37177 Hardegsen
Bausachverständigenbüro Strecker
Herr Strecker
Pestalozzistr. 121
72762 Reutlingen

23/06/2025

Seite: 1 / 4

Prüfbericht-Nr.: 25-06725, REM

Ihr Auftrag: PA-K202502-126 Bahnhof Treuchtlingen vom 12.06.2025

Probeneingang am: 16.06.2025 Probenzahl: 9
Bearbeitungszeitraum: 16.06.2025 - 23/06/2025

Sehr geehrter Herr Strecker,

anbei die Ergebnisse der rasterelektronenmikroskopischen Untersuchung Ihrer Probe(n) auf Asbest gemäß VDI-Richtlinie 3866, Blatt 5:2017-06 und KMF-Fasern gemäß CRB REM PA 14:2017-07.

Der Asbestmassengehalt wurde in 5 Mengenklassen eingeteilt: Klasse 1 (Spuren von Asbest nachgewiesen), Klasse 2 (1-5 %), Klasse 3 (5-20 %), Klasse 4 (20-50 %) und Klasse 5 (>50 %). Bei dieser Einteilung handelt es sich um nicht validierte Schätzungen.

Verwendete Abkürzungen:

- KL** Mengenkategorie Asbest (Asbestmassengehalt)
- KMF** Künstliche Mineralfasern
- WHO** KMF mit einem Durchmesser $D < 3 \mu\text{m}$, einer Länge $L > 5 \mu\text{m}$ und einem Verhältnis $L / D > 3$ (gem. TRGS 905)
- ES / B** Dokumentation des positiven Befundes durch Elementenspektrum (ES) und REM-Bild (B)
- MP / SP** MP - Materialprobe = Bruchflächenuntersuchung, Nachweisgrenze 1,0 Massenprozent
SP - Streupräparat oder Staubprobe, Nachweisgrenze 0,1 Massenprozent

Sollten Sie Fragen zu den Ergebnissen haben steht Ihnen unser(e) verantwortliche(r) Prüfer(in) unter der Telefonnummer 05505/94098-13 gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
CRB Analyse Service GmbH

Geprüft und freigegeben:

i.V. Dr. Stefan Pierdzio
Laborleiter

Verantwortliche(r) Prüfer(in):

Dr. Stefan Pierdzio
Laborleiter

Das Probenmaterial wurde durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

Die vom Labor gelieferten Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die bezeichneten Prüfobjekte. Der Prüfbericht darf auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung der CRB Analyse Service GmbH vervielfältigt werden. Originalproben und Präparate werden 3 Monate aufbewahrt.

Prüfbericht-Nr.: 25-06725, REM

P01: Dämmung Rohleitungen; Keller, Treppenhaus (CRB-Nr.: 294155)						
Asbest	KL	KMF	WHO	Probenbeschreibung Einschätzung des Prüfers, nicht Teil des Prüfberichtes	MP / SP	ES / B
nicht nachgewiesen		Glaswolle	ja	Feststoff - künstliche Mineralfasern (KMF)	MP	1

P03: Fugen- und Fliesenkleber, Putz; EG, TH1, WC (CRB-Nr.: 294156)						
Asbest	KL	KMF	WHO	Probenbeschreibung Einschätzung des Prüfers, nicht Teil des Prüfberichtes	MP / SP	ES / B
nicht nachgewiesen		nicht nachgewiesen		Feststoff - mineralische Bestandteile	SP	

P07: Innenputz; EG, Gaststätte (CRB-Nr.: 294157)						
Asbest	KL	KMF	WHO	Probenbeschreibung Einschätzung des Prüfers, nicht Teil des Prüfberichtes	MP / SP	ES / B
nicht nachgewiesen		nicht nachgewiesen		Feststoff - mineralische Bestandteile	SP	

P08: Teppichboden; EG, ehem. Fahrkartenverkauf (CRB-Nr.: 294158)						
Asbest	KL	KMF	WHO	Probenbeschreibung Einschätzung des Prüfers, nicht Teil des Prüfberichtes	MP / SP	ES / B
nicht nachgewiesen		nicht nachgewiesen		Feststoff - C (organisch, Bodenbelag o.ä.) + mineralische Bestandteile	SP	

P09: Bodenbelag; 1.OG, Wohnung Gaststätte (CRB-Nr.: 294159)						
Asbest	KL	KMF	WHO	Probenbeschreibung Einschätzung des Prüfers, nicht Teil des Prüfberichtes	MP / SP	ES / B
nicht nachgewiesen		nicht nachgewiesen		Feststoff - C-Cl (PVC) + Ca-Ti-O (mineralische Bestandteile)	MP	

P10: Fugen- und Fliesenkleber, Putz; 1.OG, Wohnung Gaststätte (CRB-Nr.: 294160)						
Asbest	KL	KMF	WHO	Probenbeschreibung Einschätzung des Prüfers, nicht Teil des Prüfberichtes	MP / SP	ES / B
nicht nachgewiesen		nicht nachgewiesen		Feststoff - mineralische Bestandteile	SP	

P13: Fugen- und Fliesenkleber; EG, Wartehalle (CRB-Nr.: 294161)						
Asbest	KL	KMF	WHO	Probenbeschreibung Einschätzung des Prüfers, nicht Teil des Prüfberichtes	MP / SP	ES / B
nicht nachgewiesen		nicht nachgewiesen		Feststoff - mineralische Bestandteile	SP	

P02: Teerartige Abdichtung, Putz; Keller, zuk. Heizungsraum (CRB-Nr.: 294162)						
Asbest	KL	KMF	WHO	Probenbeschreibung Einschätzung des Prüfers, nicht Teil des Prüfberichtes	MP / SP	ES / B
nicht nachgewiesen		nicht nachgewiesen		Feststoff - C (organisch) + mineralische Bestandteile	SP	


Prüfbericht-Nr.: 25-06725, REM

P11: Bodenbelag; 1.OG, Wohnung Gaststätte (CRB-Nr.: 294163)						
Asbest	KL	KMF	WHO	Probenbeschreibung Einschätzung des Prüfers, nicht Teil des Prüfberichtes	MP / SP	ES / B
nicht nachgewiesen		Steinwolle	nein	Feststoff - C (organisch, Bodenbelag o.ä.) + mineralische Bestandteile	SP	


1 Anlage(n) - Ende Ergebnisdarstellung

Prüfbericht-Nr.: 25-06725, REM: Anlageblatt 1 / 1

Probenbezeichnung: P01: Dämmung Rohleitungen; Keller, Treppenhaus - (CRB-Nr.: 294155)

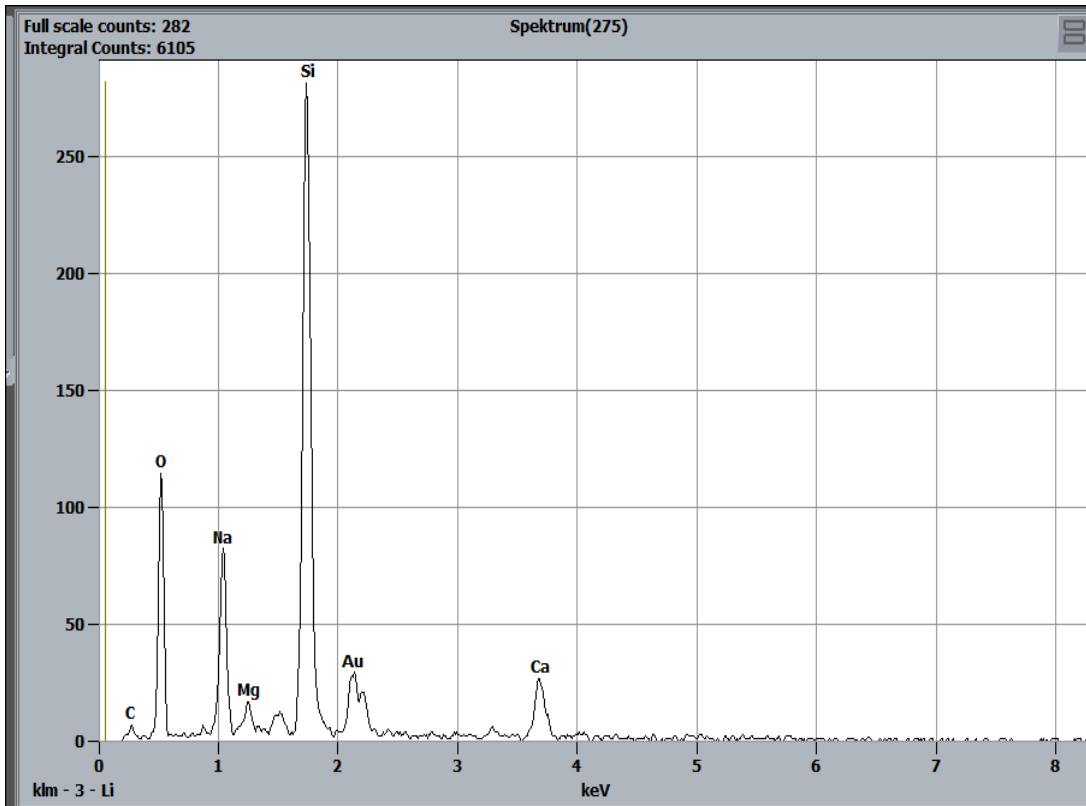

ES 1

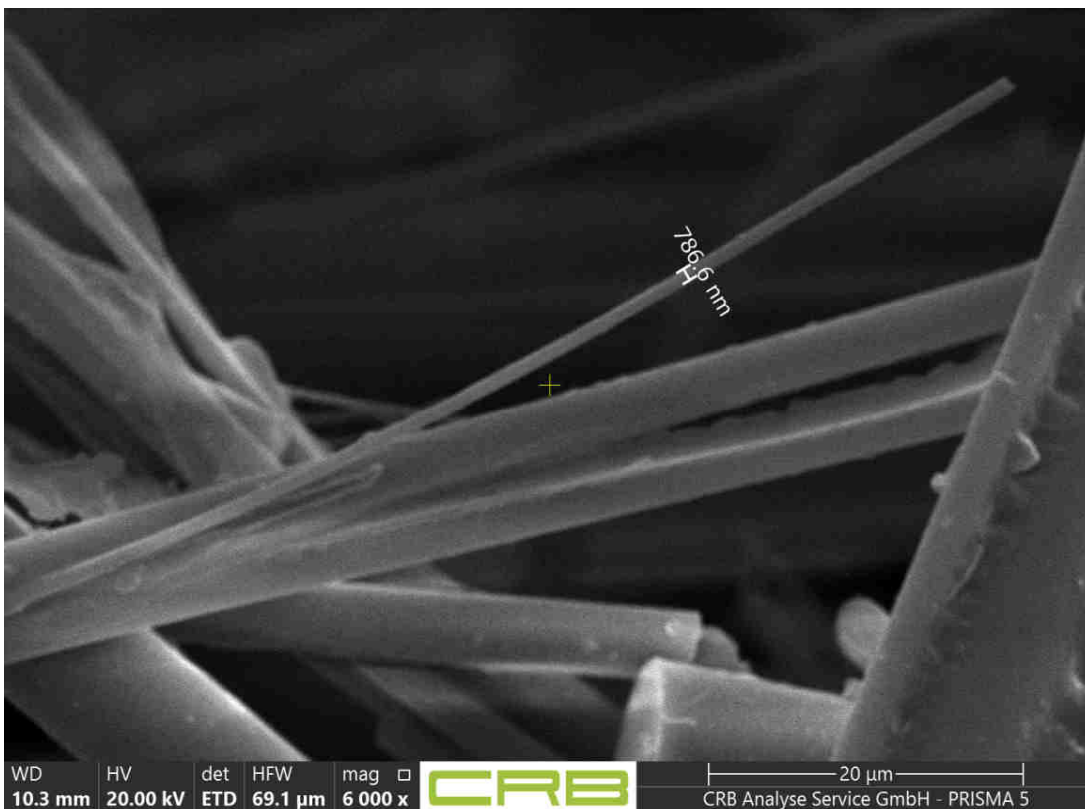

B 1
