


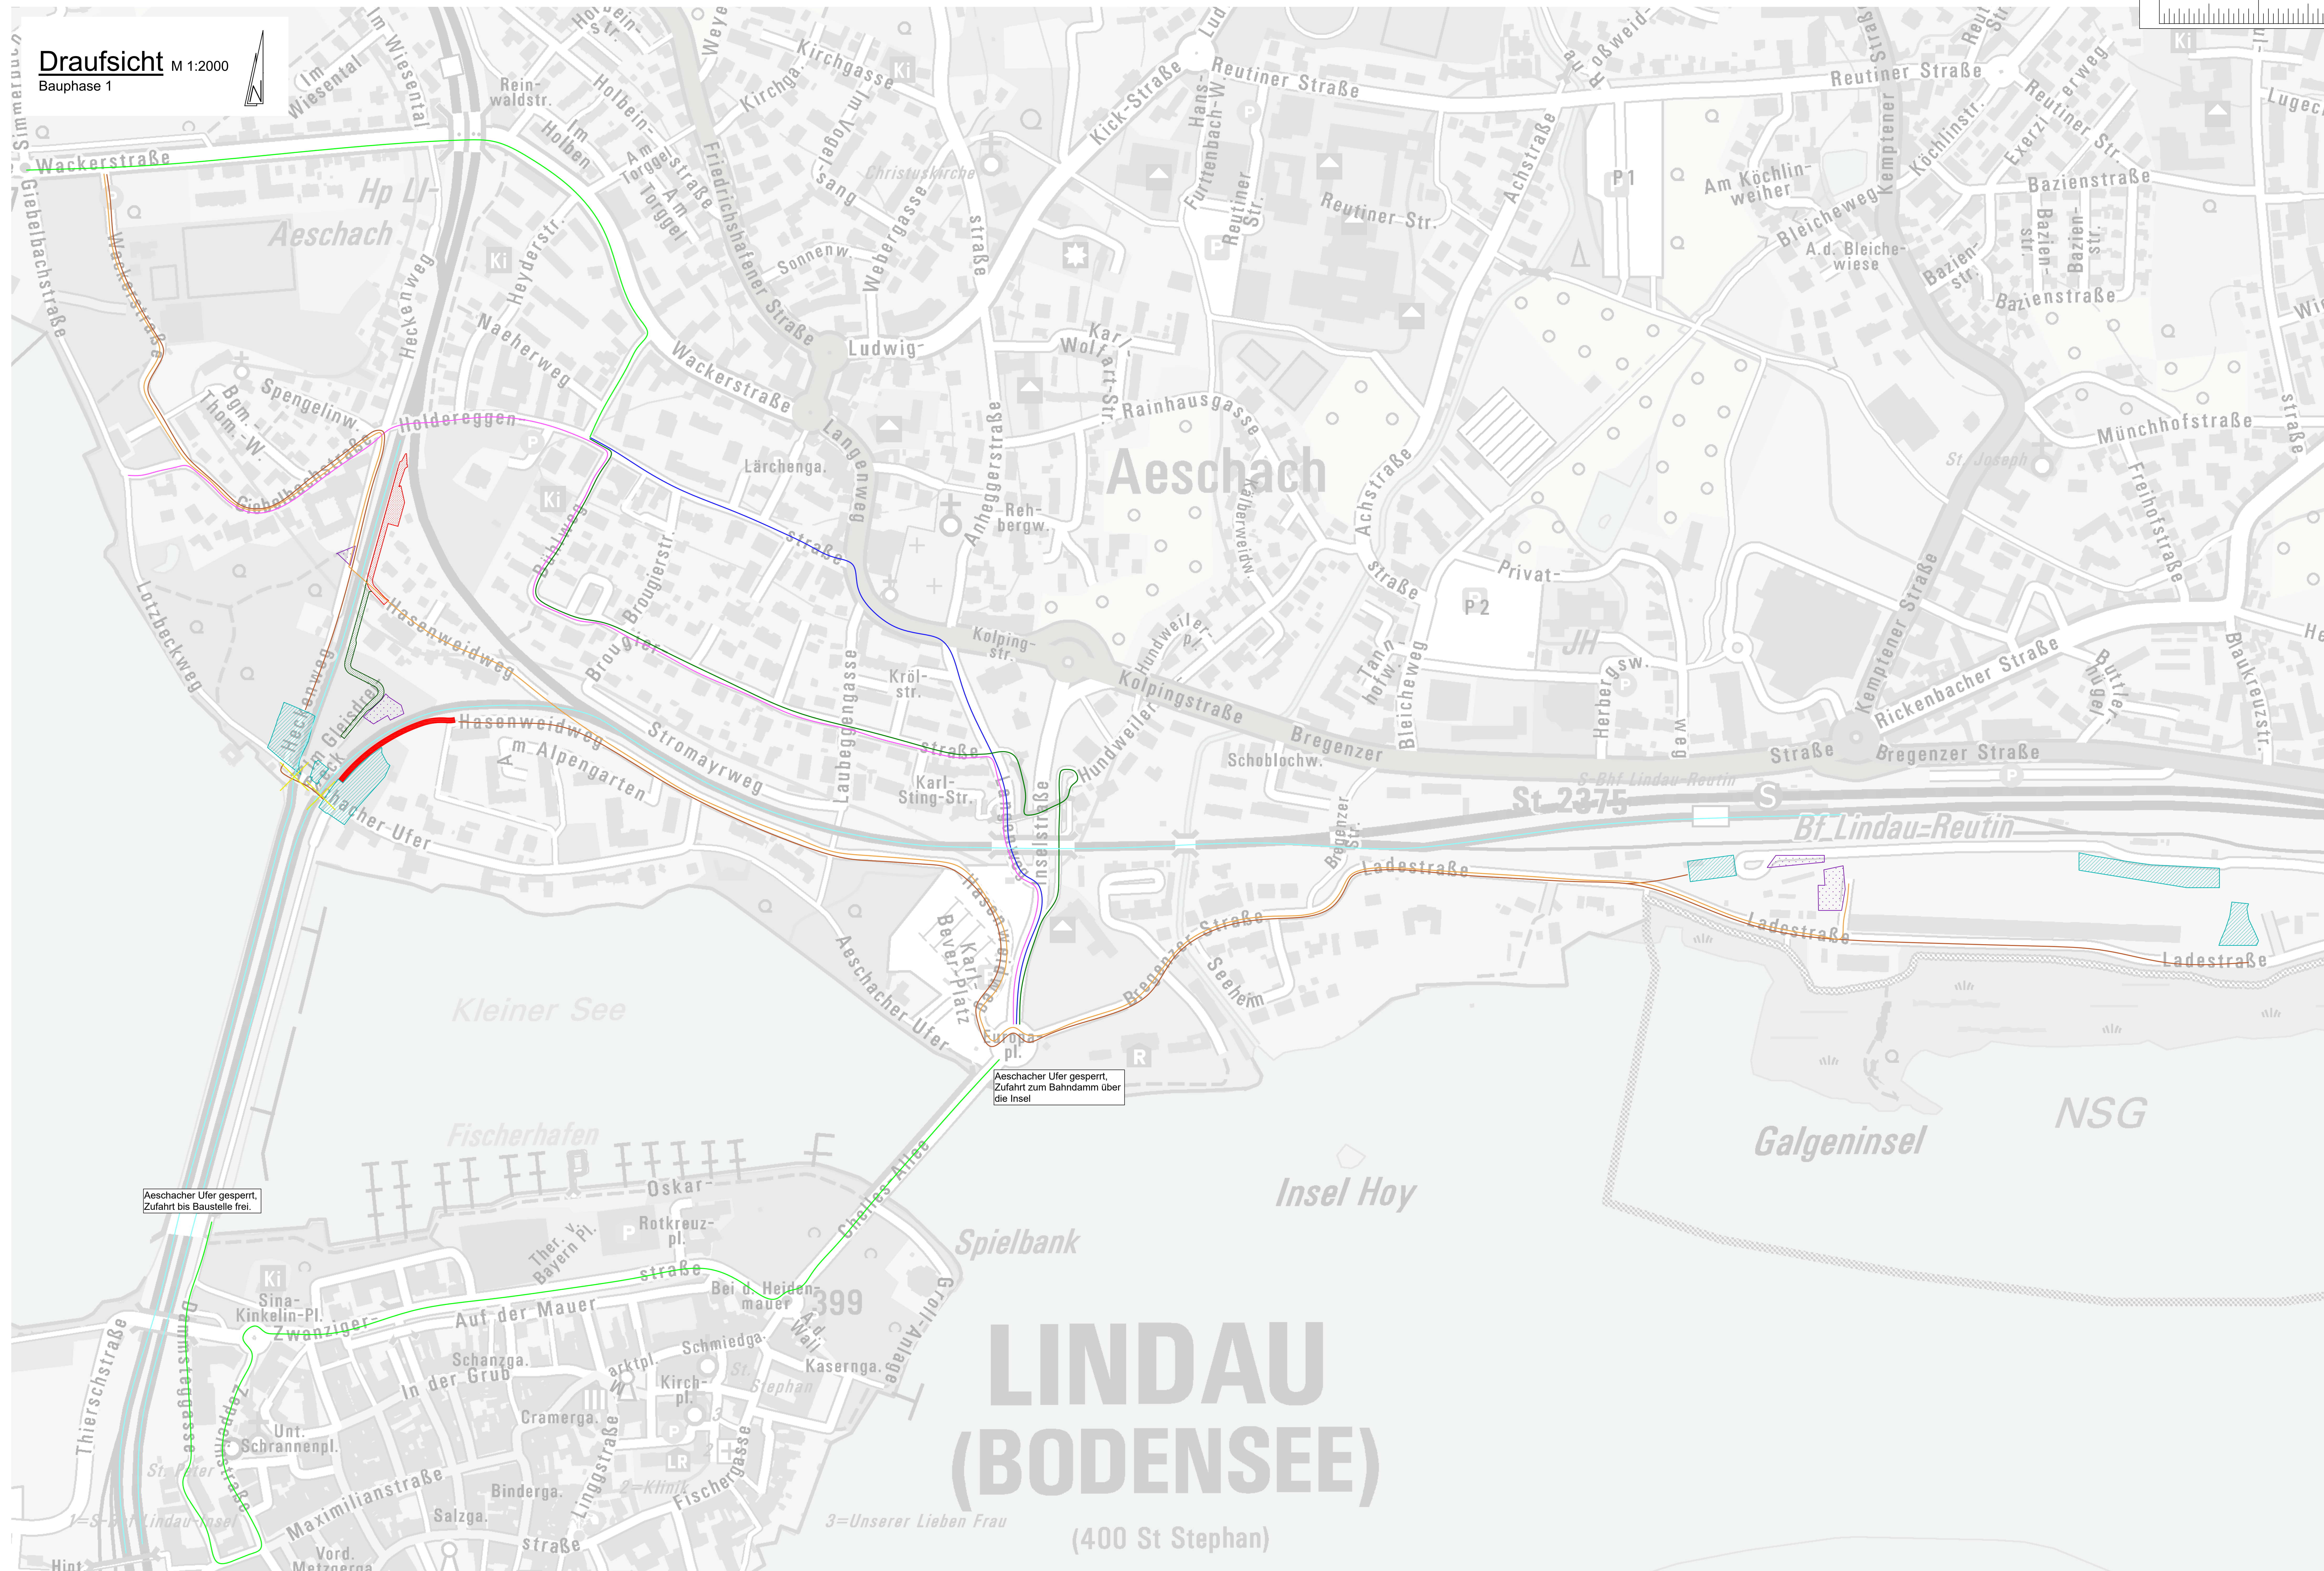

Bauphase 1	25.10.27 - 08.08.28
-------------------	----------------------------

- **Sperrung Ge-RI-Gleis Strecke 5362**
- **Neubau SÜ Holdereggerstraße Westseite**
 - Andienung über gesperrtes Gleis und BÜ s im Einbahnverkehr
 - Ausbohren Gleis Str. 5362, Herstellen Zufahrt Flurstück 58/7 (Andienung WL West)
 - Baufeldfreimachung / Leitungsverlegung (DB) zur Herstellung SÜ WL Süd und SW im nördlichen Gleisdreieck
 - Str. 5421 - Gleisseitige verbau WL West, Einbringen vom Gleis aus
 - Herstellung Tiefgründung WL West (SÜ und FÜ), Herstellung vom Gleis aus
 - Spundwandverbau Str. 5362 (GRG), Herstellung vom Gleis aus, Arbeitsebene feldseitig herstellen (Zu- und Abfahrt vom Hasenweg ohne Wendemöglichkeit)
 - Verbau Str. 5362 (RG), GEWI-Stäbe in Schwellenfächer einbauen
- **Einbau Mast 151-33, durch AN_{OLA}**
 - Herstellung Pfahlkopfbalken
 - Str. 5421 Gleisseitige Schalung herstellen
 - WL / Anschlussflügel / Auflager FÜ herstellen

- **Herstellung Stützwände im Gleisdreieck**
- Gründung Stützkonstruktionen
- Herstellung Stützkonstruktionen, Andienung nur vom Gleis aus möglich
- Kappenherstellung / Geländer
- Einbau HF WL West und Anschlussbauwerke, Einbau straßenseitig

- **Vorbereitung Überbau SÜ**
- Herrichten Montageplatz für Überbau
- Anlieferung Längsträger SÜ über Logistikleis
- Montage Überbau auf Montageplatz

- Fertigstellung OLA / Ergänzung Oberleitung über Str. 5362 (GRG), Vollsperrung Strecken 5362 und 5421, durch AN_{OLA}

- AN Lotzbeckweg

- Beginn der Bauarbeiten BÜ-Beseitigung Lotzbeckweg ab 01/2019
- Verlängerung "Am Alpengarten" als Baustraße, Herstellung Bohrpfahlwände West Andienung über Baustraße und Lotzbeckweg

**Darstellung Bauphase 1 gilt bis zum 02.07.2028.
Im Zeitraum 03.07. -08.08. Verkehrsführung analog
Bauphase 3 (über Wackerstraße)**

Legende

- Umleitung Radfahrer beide Richtungen
- Umleitung Radfahrer Fahrtrichtung von Westen nach Osten
- Umleitung Radfahrer Fahrtrichtung von Osten nach Westen
- Umleitung Fußgänger
- Baustellenzu- und abfährt Gleisdreieck
- Baustellenzu- und abfährt Logistikgleis
- Baustellenzu- und abfährt Lotzbeckstraße
- Im Bauzustand
- In Betrieb
- BE-Flächen Holdereggenstraße
- BE-Flächen Lotzbeckstraße
- BÜ außer Betrieb, Durchfahrt nicht möglich

Index; Änderungen bzw. Ergänzungen	Name: _____ Datum: _____
Nur für die Ausschreibung gültig	
Prüfmerke	
die Übereinstimmung der Zeichnung mit der Ausführung bestätigt:	
für den Auftragnehmer: _____ Orl. Datum, Name in Druckschriftzeichen, Unterschrift	Freigabe zur _____ Prüfung 3.3.1.1.4 Orl. Datum, Name in Druckschriftzeichen, Unterschrift Prüfmerkmale
für die DB: _____ Orl. Datum, Name in Druckschriftzeichen, Unterschrift	
Interoperabilität geprüft (besondere Ställe), Name: _____ Orl. Datum, Name in Druckschriftzeichen, Unterschrift geprüft Qualitätsbescheinigung: _____	
Orl. Datum, Name in Druckschriftzeichen, Unterschrift geprüft Eisenbahn-Bundesamt	
DB InfraGO Freigabe der Ausschreibungunterlagen (2 mit Beglaubigung durch den BVR) Freigabe-Nr.: _____	
Orl. Datum, Name in Druckschriftzeichen, Unterschrift (BVR) Genehmigung zur Bauausführung	
gleichgestellt mit Prüfverfahrenplan	
Orl. Datum, Name in Druckschriftzeichen, Unterschrift Bauteil: DB InfraGO Projektleitung: DB InfraGO	Planung: KB Auftragnehmer (AG): _____
DB InfraGO AG Anlagen- und Infrastrukturmanagement Netz Augsburg I.L.S. AG Völkensriede, 3 88150 Augsburg	Konstruktionsteilgruppe Bauwesen AG Ingenieurbüro (St. Bauwesen) Bahnhofsplatz 1 81435 Kempten Kempten, 11.02.2008 Orl. Datum, Unterschrift
Orl. Datum, Unterschrift Legende (unverändert)	Orl. Datum, Unterschrift G 016181181
Projekt Nr. 0000000000	
BM-Datenzeichnung	
Planchen: Anlage 7.5.2	
Plan: Entwurf	
Höhen- und Koordinatensystem: DB-REF 2016	
Einwirkungen (Lärmstudie)	
Entwurfsschwindigkeit: _____	
Kilometer: _____	
Bauwerksnummer: _____ Birk-Kennziffer: _____ Bundesnummer: _____	
Strasse: 5420	Linien- und Laufstrecken-Grenze
12000 Event: 03.02.2008 Länd: _____ Oerfl: 03.02.2008 Eggung: _____ Freigegeben: _____	Maßnahmenbündel im Bahnknoten Lindau Maßnahme G. Beibehaltung des Bahnübergangs Hasenwiesweg Ost Baugleichstellungs- Bauphase 1 / 25.10.27 - 08.08.2
EP	Datum: _____ Name: _____
