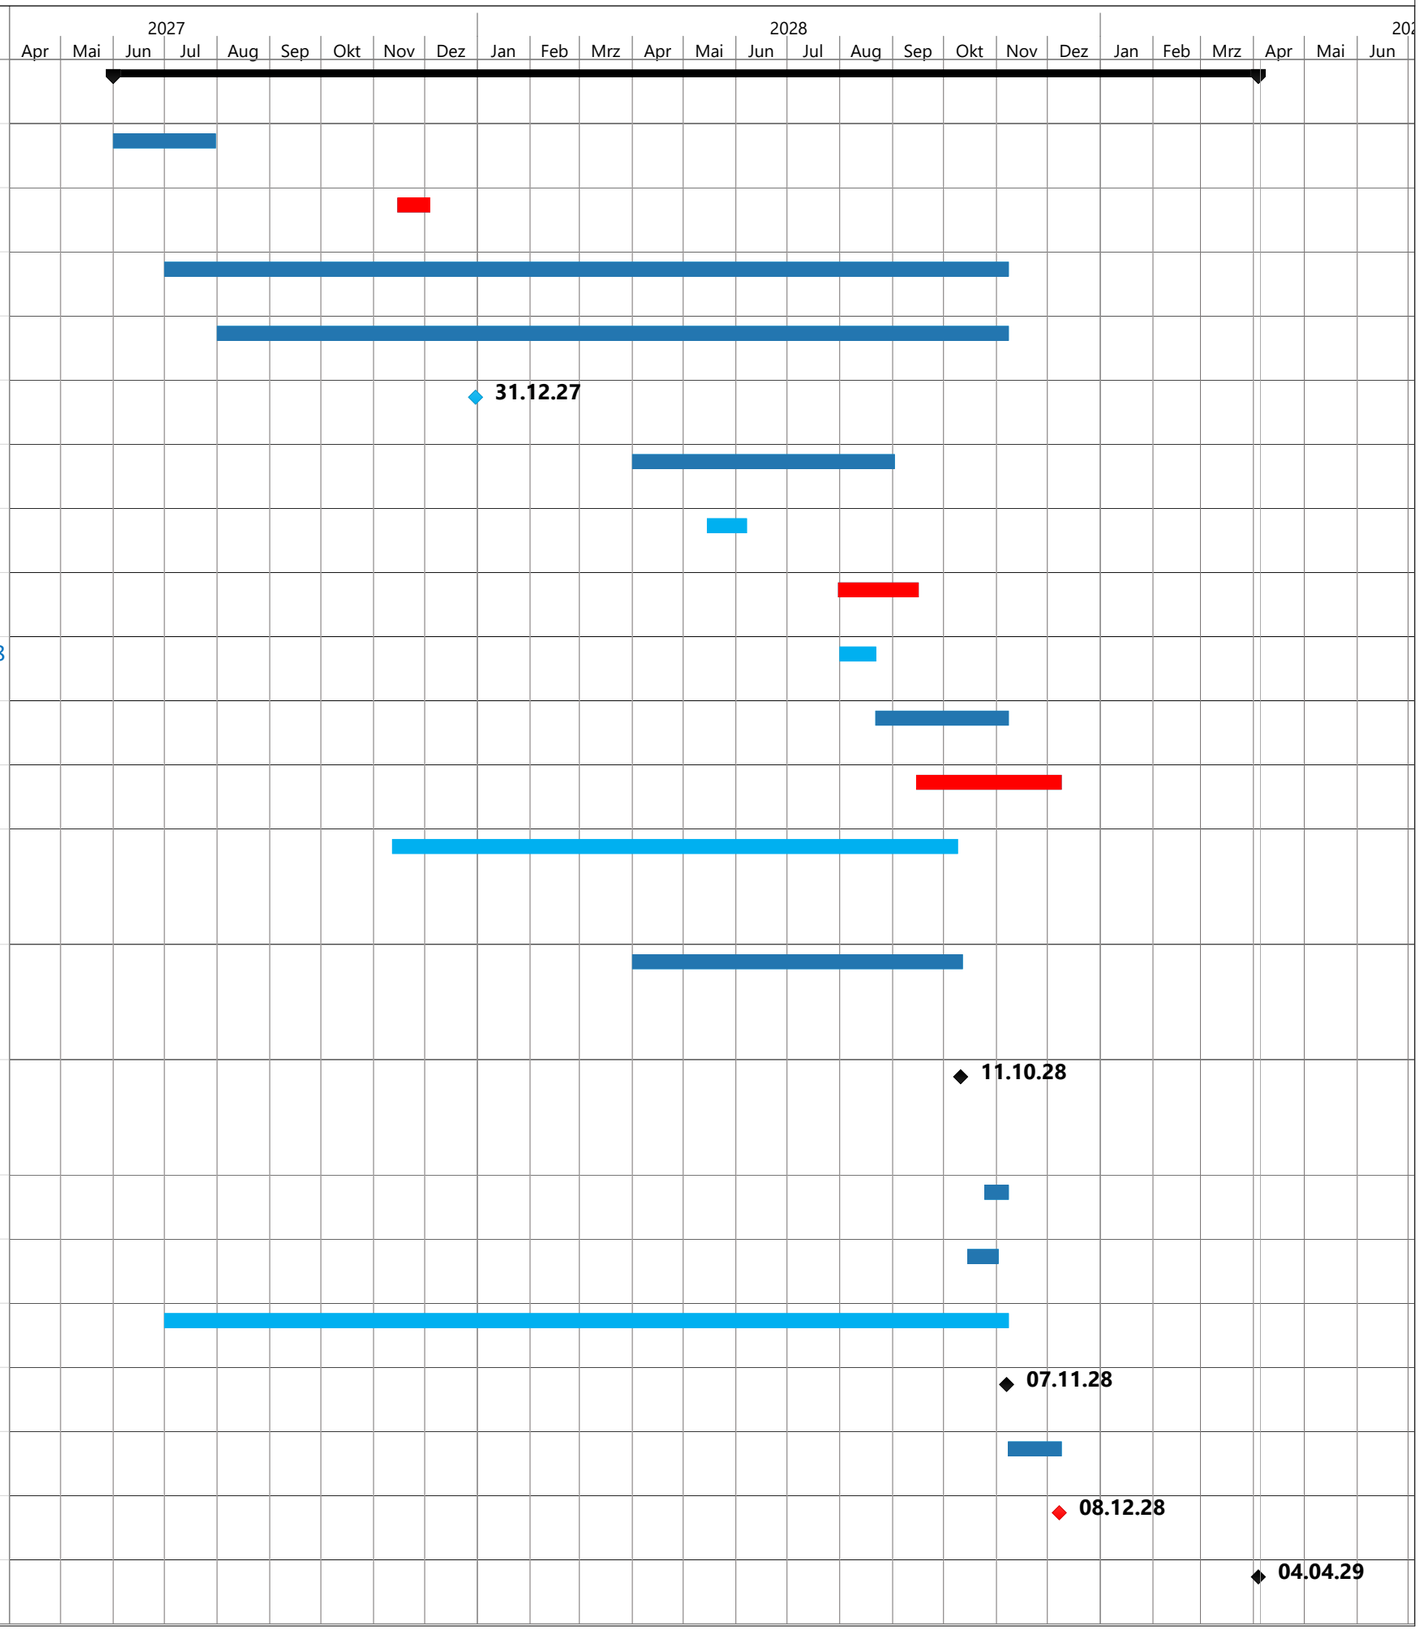Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende
1	**Cornberger Tunnel, VE04 - Bauleistung für TK-Anlagen**	**Die 01.06.27**	**Mit 04.04.29**
2	BE einrichten	Die 01.06.27	Fre 30.07.27
3	Sperrpausen Mo-Fr - Gleis 1 bzw. 702/703, 5:00-21:00 Uhr	Mon 15.11.27	Fre 03.12.27
4	Herstellung TK-Ausrüstung ESTW-Z (KAG: TNR, BOS und EMA/BM	Don 01.07.27	Die 07.11.28
5	Herstellung TK-Ausrüstung TGW (KAG: TNR, BOS und EMA/BMA)	Son 01.08.27	Die 07.11.28
6	Fertigstellung und Abnahme Tunnelbauwerk (Dritte)	Fre 31.12.27	Fre 31.12.27
7	Einbau BOS-Funk Leckkabel bahnlinks	Sam 01.04.28	Fre 01.09.28
8	Tunnel: Einbau Grundschotter (Dritte)	Mon 15.05.28	Die 06.06.28
9	Sperrung Gleis 703	Mon 31.07.28	Fre 15.09.28
10	Einbau Bauweiche und Herstellung Oberbau im Tunnel (Dritte)	Die 01.08.28	Mon 21.08.28
11	Einbau Notruffernsprecher und OB-Steckdosen Neubautunnel	Die 22.08.28	Die 07.11.28
12	Totalsperrung 2028 - Gl. 701,702,703	Fre 15.09.28	Fre 08.12.28
13	Verlegung Kabelredundanz F6622 ESTW-Z - Stw Bebra West und F6580 (Dritte)	Fre 12.11.27	Son 08.10.28
14	Kabelredundanz F6622 ESTW-Z - Stw Bebra West und F6580: Muffen inkl. Messen	Sam 01.04.28	Mit 11.10.28
15	Fertigstellung Kabelredundanz F6622 ESTW-Z - Stw Bebra West und F6580	Mit 11.10.28	Mit 11.10.28
16	Kabel muffen/spleißen, auflegen, messen	Mit 25.10.28	Die 07.11.28
17	Aufbau GeFo-Endgeräte	Son 15.10.28	Mit 01.11.28
18	Aufbau ÜT-Technik, DB MAS, GSM-R (Dritte)	Don 01.07.27	Die 07.11.28
19	Fertigstellung aller Bauleistungen	Die 07.11.28	Die 07.11.28
20	Mitwirken bei Abnahme und Inbetriebnahme	Mit 08.11.28	Fre 08.12.28
21	Inbetriebnahme	Fre 08.12.28	Fre 08.12.28
22	Abschluss aller Arbeiten	Mit 04.04.29	Mit 04.04.29
