lfd.Nr.	Benennung der Angaben	
1	Ort der Kabeleinführung	
2	Kabelendgestell / -einsatz (KEE / KEG)	
3	Aufteil-Kabel	Aufbau Länge (m)
4	Stich-Kabel	Kabelendverzweiger / KAG Aufbau Länge (m)
5	Stammkabel	Mehrlänge (m)
6		Muffenbezeichnung
7		Kabelaufbau
8		lfd. Nr.der Werklänge
9		Trommelnummer
10	Trassen aufmaß	Gesamt (m)
11		Abstand der Garnituren (m)
12	wirkliche Länge	Metermarkierung in (m)
13		Abstand der Garnituren (m)
14		Gesamt (m)
15	äußere Länge	Metermarkierung auf Kabelmantel
16		Bahnkilometer
17		Lageplan - Barcodenummer

Faserlänge incl. Spleißzuschläge und Pigtail in (m)	Fasernummer
	1 - 24
	25 - 48
	7 - 8, 19 - 20, 43-44

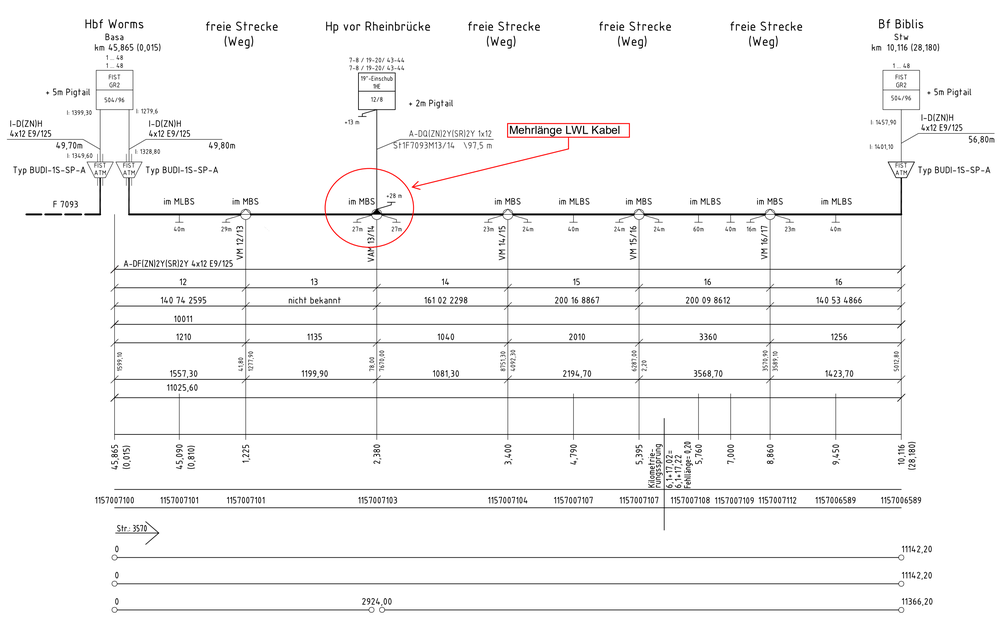

Zeichenerklärung

Endeinrichtung
1...48 Fasern ank.
1...48 Fasern abg.
FIST GR — Endeinrichtung Typ
Soll/Ist — Belegung
Aufteilungsmuffe (M)
Verbindungsmuffe (M)
Verbindungsabzweigmuffe / Muffe mit vorbereitetem Abzweig (VM)
Verbindungsabzweigmuffe mit Abzweig (VAM)
LWL Streckenkabel
Aufteilungskabel
XXm — Pluslänge in m

Lieferung der Kabelanlage		
Gegenstand	Lieferwerk	Lieferzeit von - bis
LWL Kabel	LAT S&G	08/13
Aufteilungskabel	Bayka	09/13
Verbindungs-muffen	Tyco	09/13
Endeinrichtung	Tyco	09/13

Verlegung		
Lieferung Leistung	Lieferwerk Unternehmer	Ausführungszeit von - bis
Lieferung der Verlegestoffe	Bauer Beton	09-11/13
Herstellung der Kunstbauten	LAT S&G	09-11/13
Kabelverlegung	T&P	10-11/13

Kabelzusammenbau		
Leistung	Unternehmer	Ausführungszeit von - bis
Verlegeaufsicht	T&P	10-11/13
Kabel-zusammenbau	GA-Netztechnik	10-12/13

Mechanische Abnahme durch		
von - bis	Name	Abteilung
05.12. - 06.12.13	E. Wurst	DB KT

Meßtechnische Abnahme durch		
von - bis	Name	Abteilung
05.12. - 06.12.13	E. Wurst	DB KT

Ablauf der Gewährleistung
am
07.12.2018

Index	Änderung	Name (Kürzel)	Datum (Kürzel)
03	B009 - EÜ Worms Nord, BW 6316 933 - Bauzustand	Tkkl	DB Intern
02	Anbindung BTS 23056 an Kabel F 7093 (48`)		
01	Bestandserstellung		
03	EÜ B009 BZ	Zinserling 04.05.2022	Stoklberger 16.05.2022	Glendel 16.11.2022	Zinserling 01.03.2023
02	Anbindung BTS	Dolinin 03.09.2024	Stefnes 06.11.2024	Waschkeit 12.12.2024	F. Kovacs 18.03.2025
01	Bestand	Becker 07.12.13	Tschirner 07.12.13		

6457012554

297x0970

AutoCAD-Zeichnung

DB InfraGO AG
Anlagen- und Instandhaltungsmanagement Netz Karlsruhe
Mittelbruchstr. 4, 76137 Karlsruhe

Ersatz für: Ersatz durch:

DB-Plannummer: 3570.0102/11_F 7093_000,015

Erstellt:
Geprüft:
Freigegeben:
B

Kabellängenplan LWL
F 7093 48` (4x12) Hbf Mannheim Stw - Bf Biblis Stw
Hbf Worms Basa - Bf Biblis Stw
3570 Worms Hbf, Gl 9 - Biblis, W 247 km 000,015 - 010,116

Datum: de
Name: ohne

EUCON-BUNG GmbH
Storkower Straße 132 | 10407 Berlin
+49 30 47 80 90-0 | eucon-berlin.de

03 | 3
