
Nr.		Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1		**ZKB Erlangen**	**80 Tage**	**Mon 11.01.27**	**Fre 30.04.27**
2		**Bauphase 1 - Baustelleneinrichtung**	**5 Tage**	**Mon 11.01.27**	**Fre 15.01.27**
3		Herstellen Absperrung in der PU, Einrichten der Baustelleneinrichtungsfläche	5 Tage	Mon 11.01.27	Fre 15.01.27
4		**Bauphase 2 - Sanierung PU Nord**	**30 Tage**	**Mon 18.01.27**	**Fre 26.02.27**
5		**Sperrung der halbe PU und Treppenaufgänge Nord**	**30 Tage**	**Mon 18.01.27**	**Fre 26.02.27**
6		Rückbau Wandbelag, Bodenbelag und Handläufe	10 Tage	Mon 18.01.27	Fre 29.01.27
7		Erneuerung Anstrich, Fließen und Handlauf	20 Tage	Mon 01.02.27	Fre 26.02.27
8		**Bauphase 3 - Umsetzen BE in Unterführung**	**3 Tage**	**Mon 01.03.27**	**Mit 03.03.27**
9		Umsetzen Staubschutzwand und prov. Beleuchtung	3 Tage	Mon 01.03.27	Mit 03.03.27
10		**Bauphase 4- Sanierung PU Süd**	**39 Tage**	**Don 04.03.27**	**Die 27.04.27**
11		**Sperrung der halbe PU und Treppenaufgänge Süd**	**39 Tage**	**Don 04.03.27**	**Die 27.04.27**
12		Rückbau Wandbelag, Bodenbelag und Handläufe	12 Tage	Don 04.03.27	Fre 19.03.27
13		Erneuerung Anstrich, Fließen und Handlauf	27 Tage	Mon 22.03.27	Die 27.04.27
14		**Bauphase 5 - Räumen der Baustelle**	**3 Tage**	**Mit 28.04.27**	**Fre 30.04.27**
15		Restarbeiten	2 Tage	Mit 28.04.27	Don 29.04.27
16		Räumen der Baustelle	1 Tag	Fre 30.04.27	Fre 30.04.27

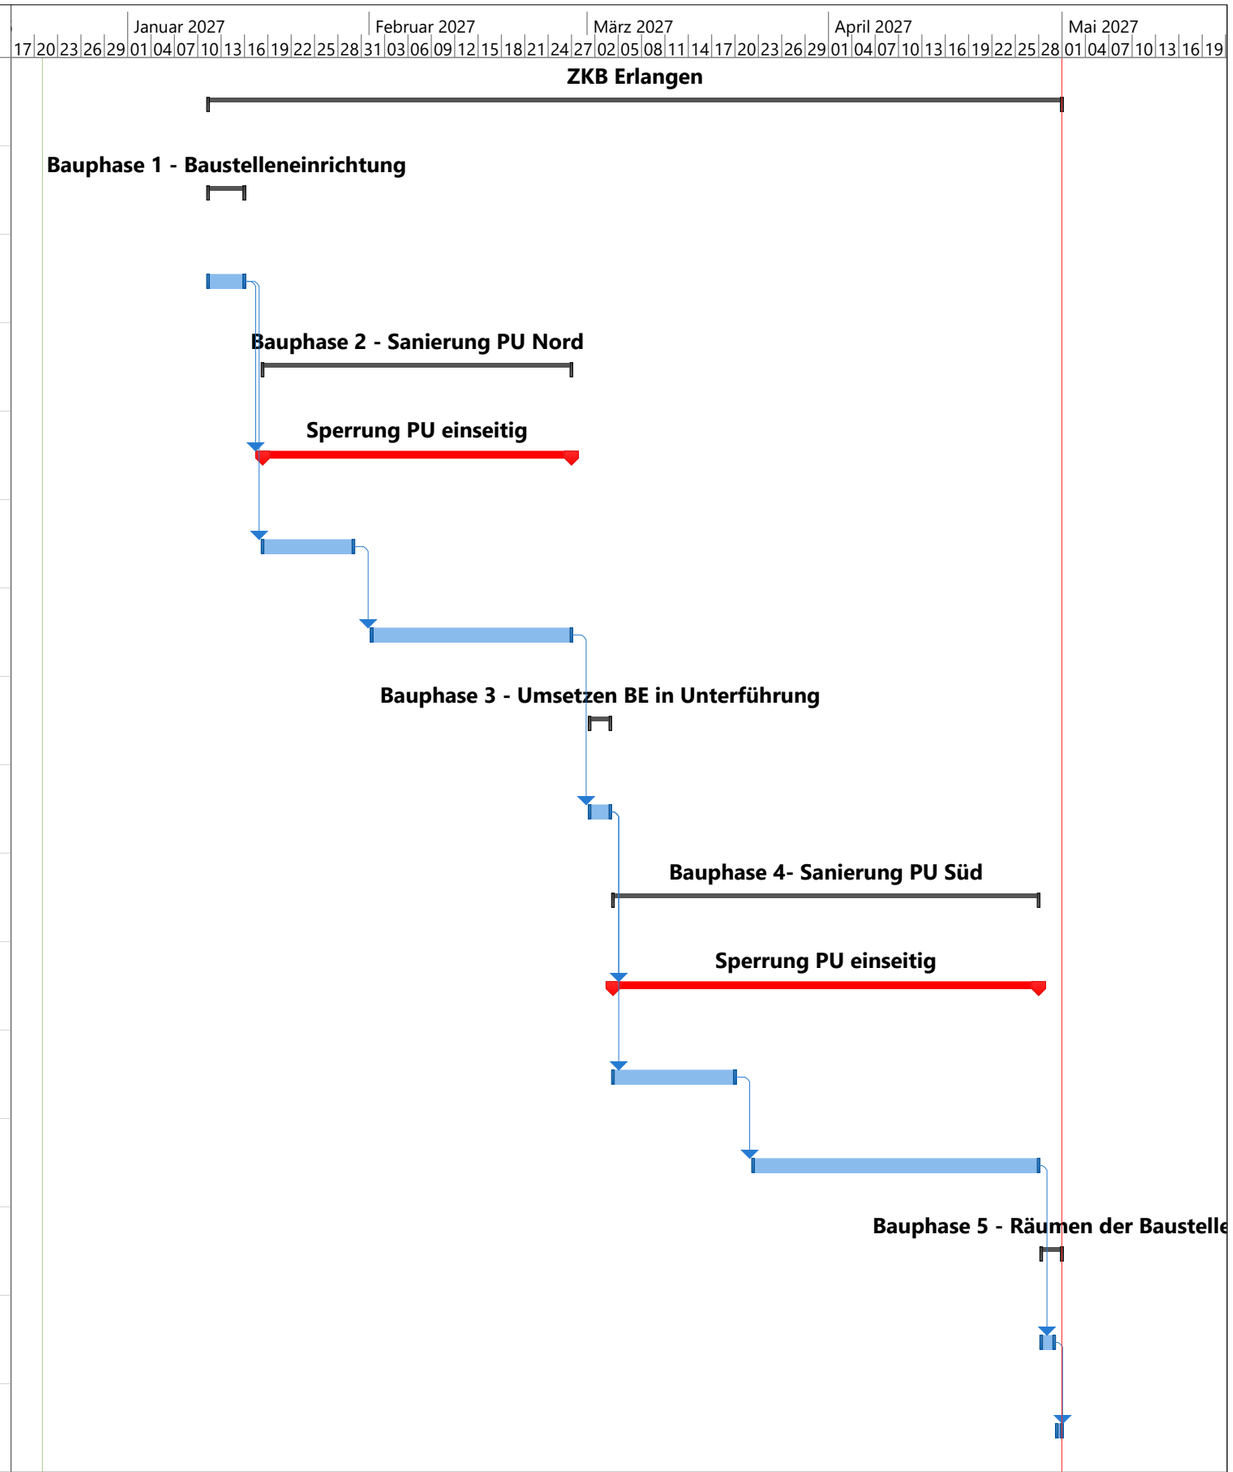

Projekt: ZKB Erlangen
Datum: Don 10.09.26

Vorgang	Projektsammelvorgang	Manueller Vorgang	Nur Anfang	Stichtag	
Unterbrechung	Inaktiver Vorgang	Nur Dauer	Nur Ende	In Arbeit	
Meilenstein	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelrollup	Externe Vorgänge	Manueller Fortschritt	
Sammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelvorgang	Externer Meilenstein		
