
Kuhn, Tobias

Von:	Björn Ruhenstroth <Bjoern.Ruhenstroth@deutschebahn.com>
Gesendet:	Dienstag, 8. Juli 2025 09:20
An:	Kuhn, Tobias
Cc:	Semih Yazlik; s.cormont@haecker-plan.de; Edin Becirovic
Betreff:	AW: Saarbrücken Hbf Aufzugsumrüstung Gebäude Neubau Ost
Anlagen:	Eurobahnhof SB 7.OG.pdf; Eurobahnhof SB 1.UG.pdf

Hallo Herr Kuhn,

ich würde dann vorschlagen die Verteilung zu erneuern und auf die neuen Anforderungen anzupassen.
Die alte Verteilung ist mehr als 40 Jahre alt und in einem entsprechenden Zustand.

Die Zuleitung kommt aus dem im Nebenraum der Aufzüge befindlichen Steigschacht.
Dieser verortet sich fast exakt oberhalb der HV Ost wo sich die Hauptsicherung befindet.
Die Grundrisspläne habe ich nochmal im Anhang mitgeschickt.

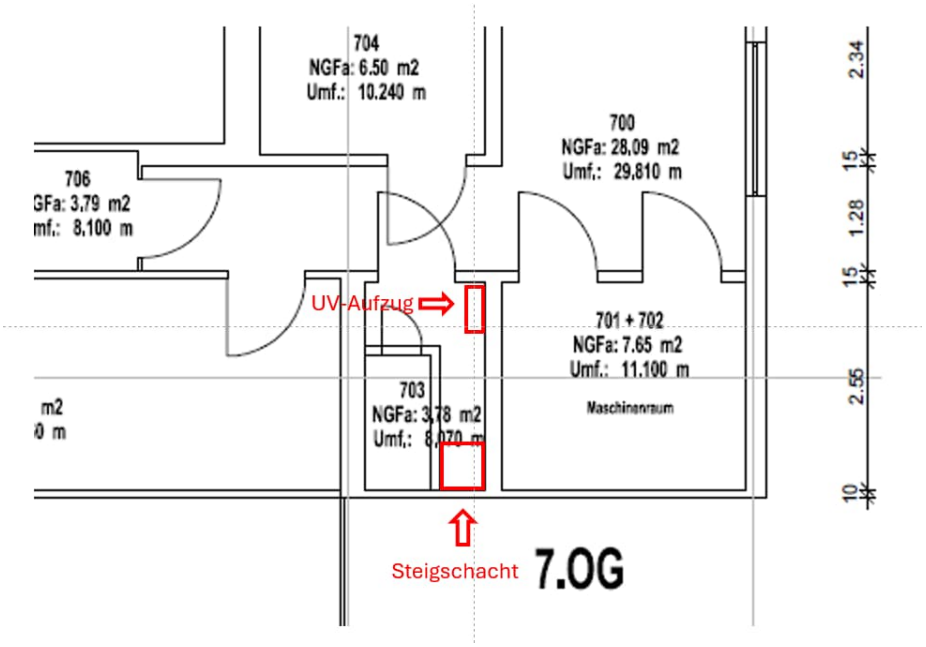

Mit freundlichen Grüßen

Björn Ruhenstroth
Elektrofachkraft
Produktionsdurchführung Facility Management und Stationsbetreuung, I.IP-MI-SBR-F

DB InfraGO AG
Am Hauptbahnhof 6-12, 66111 Saarbrücken
Tel. +49 681 308 1440
Mobil: 01523 7476585
MS Teams: Chat | Call

Von: Kuhn, Tobias <Tobias.Kuhn@eto.de>
Gesendet: Montag, 7. Juli 2025 10:20
An: Björn Ruhenstroth <Bjoern.Ruhenstroth@deutschebahn.com>
Cc: Semih Yazlik <Semih.Yazlik@deutschebahn.com>; s.cormont@haecker-plan.de; Edin Becirovic

<E.Becirovic@haecker-plan.de>
Betreff: Saarbrücken Hbf Aufzugsumrüstung Gebäude Neubau Ost

Hallo Herr Ruhenstroth,

Sie hatten mich ja vor einiger Zeit bei der Vorortbegehung für die Aufzugsumrüstung im Gebäude Neubau Ost beim Saarbrücken Hbf begleitet.
Vorort hatten wir ursprünglich abgestimmt, dass die UV B 9.00 im sep. Technikraum neben den Maschinenräumen entfallen kann, da u.a. die Aktenaufzüge bereits außer Betrieb sind. Nun ist mir bei der Bearbeitung aufgefallen, dass die Maschinenraumbeleuchtung scheinbar noch von dieser Verteilung versorgt wird. Soll hierfür eine neue UV Maschinenraum errichtet werden, von welcher die Aufzugsanlage und die bestehende Maschinenraumbeleuchtung versorgt wird oder soll die Bestandsverteilung evtl. doch komplett bestehen bleiben? Die Ventilatoren werden nicht mehr benötigt, sodass die elektrischen Anschlüsse (der angesetzte Kasten rechts im Bild) auch entfallen können.

Haben Sie zufälligerweise einen Lageplan oder Grundrisspläne von dem Gebäude, in welche der Kabelweg von der HV B im Keller bis zum Maschinenraum eingezeichnet werden kann.


Vielen Dank im Voraus für Ihre Rückmeldung. Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Tobias Kuhn
Anlagenbau
fon: +493729836225
fax: +49 37298 36 4201
mail: Tobias.Kuhn@eto.de
mobil: +49172 7275536

Elektrotechnik Oelsnitz/E. GmbH
Hoffeldstrasse 3
D-09376 Oelsnitz/Erz.

Registergericht AG Chemnitz, HR B 21246
Geschäftsführer: Björn Hartlich





Bitte beachten Sie unsere aktuelle Datenschutzerklärung auf unserer Webseite unter https://www.eto.de/datenschutz

---

Pflichtangaben anzeigen

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier:
https://www.deutschebahn.com/de/konzern/datenschutz
