
Nr.	Vorgangsmodus	Vorgangsname	Anfang	Fertig stellen
1		**BV: Ern. zwei Stützwände in Feldafing**	**02.11.2026**	**31.03.2028**
2		Beginn der Planungsleistung durch den AN	07.12.2026	07.12.2026
3		Vorlage der vollständigen, genehmigungsfähigen Ausführungsunterlagen	12.02.2027	12.02.2027
4		Beginn der Ausführung an der Baustelle	01.03.2027	01.03.2027
5		**Bauphase 1: Vorbereitende Maßnahmen**	**02.11.2026**	**26.03.2027**
6		Freischnitt (AG)	02.11.2026	26.02.2027
7		Freimachung Baubereich (AG)	01.03.2027	26.03.2027
8		Vorarbeiten AN (TK)	01.02.2027	26.03.2027
9		Vorarbeiten AN (LST)	01.02.2027	26.03.2027
10		Vorarbeiten OLA	01.02.2027	26.03.2027
11		**Bauphase 2 Herstellen Stützwand bahnlinks**	**17.04.2027**	**18.11.2027**
12		**Bauphase 2.1 Rückbau/Abbruch**	**17.04.2027**	**16.05.2027**
13		Abschalten und Erden der OLA durch AG	17.04.2027	17.04.2027
14		Abbruch Bestand und Herstellen bauzeitliche Böschung mit Böschungssicherung	17.04.2027	16.05.2027
15		**Bauphase 2.2 Tiefgründungen**	**17.05.2027**	**12.06.2027**
16		Herstellen Bohrebene	17.05.2027	19.05.2027
17		Herstellen Bohrpfähle	19.05.2027	11.06.2027
18		Fertigstellung Bohrpfahlgründung bahnlinks	11.06.2027	11.06.2027
19		Einschalten OLA durch AG	12.06.2027	12.06.2027
20		**Bauphase 2.3 Herstellung Stützwand**	**19.07.2027**	**18.11.2027**
21		Rückbau Bohrebene	19.07.2027	20.07.2027
22		Freiligen und zurückspitzen Bohrpfahlköpfe	21.07.2027	06.08.2027
23		Schalen, Bewehren und Betonieren der Stützwand	06.08.2027	15.11.2027
24		Ausschalen, Abdichten und Montage Geländer	06.09.2027	18.11.2027
25		**Bauphase 2.4 Hinterfüllung**	**08.11.2027**	**18.11.2027**
26		Abschalten und Erden der OLA durch AG	08.11.2027	08.11.2027
27		Herstellen Hinterfüllung	08.11.2027	18.11.2027
28		Einschalten OLA durch AG	18.11.2027	18.11.2027
29		Fertigstellung Stützwand bahnlinks	18.11.2027	18.11.2027
30		**Bauphase 3 Herstellen Stützwand bahnrechts**	**19.06.2027**	**15.07.2027**
31		**Bauphase 3.1 Rückbau/Abbruch**	**19.06.2027**	**21.06.2027**
32		Abschalten und Erden der OLA durch AG	19.06.2027	19.06.2027
33		Gleisrückbau (ca. 160 m)	19.06.2027	19.06.2027
34		Abbruch Bestand und Herstellen bauzeitliche Böschung mit Böschungssicherung	19.06.2027	21.06.2027
35		**Bauphase 3.2 Tiefgründungen**	**21.06.2027**	**25.06.2027**
36		Herstellen Bohrebene	21.06.2027	21.06.2027
37		Herstellen Bohrpfähle	21.06.2027	25.06.2027
38		**Bauphase 3.3 Herstellung Stützwand**	**01.07.2027**	**05.07.2027**
39		Rückbau Bohrebene	01.07.2027	01.07.2027
40		Freiligen und zurückspitzen Bohrpfahlköpfe	01.07.2027	03.07.2027
41		Schalen, Bewehren und Betonieren der Stützwand	02.07.2027	05.07.2027
42		**Bauphase 3.4 Hinterfüllung + TE**	**11.07.2027**	**15.07.2027**
43		Ausschalen und Abdichten der Stützwand	11.07.2027	12.07.2027
44		Herstellen Hinterfüllung	12.07.2027	14.07.2027
45		Abbruch Bestand und Neubau TE	13.07.2027	15.07.2027
46		Montage Geländer	13.07.2027	15.07.2027
47		Herstellen Gleisanlage	14.07.2027	15.07.2027
48		Einschalten OLA durch AG	15.07.2027	15.07.2027
49		Fertigstellung Stützwand bahnrechts	16.07.2027	16.07.2027
50		Fertigstellung Oberbau zur Inbetriebnahme	16.07.2027	16.07.2027
51		**Bauphase 4: Beräumen der Baustelle**	**29.11.2027**	**10.12.2027**
52		Rückbau BE-Flächen	29.11.2027	03.12.2027
53		Beräumen der Baustelle	06.12.2027	10.12.2027
54		Abnahmereife Fertigstellung aller Leistungen auf der Baustelle	17.12.2027	17.12.2027
55		Übergabe der vollständigen Bestandsunterlagen	15.10.2027	15.10.2027
56		Fertigstellung der vertraglichen Leistung	31.03.2028	31.03.2028

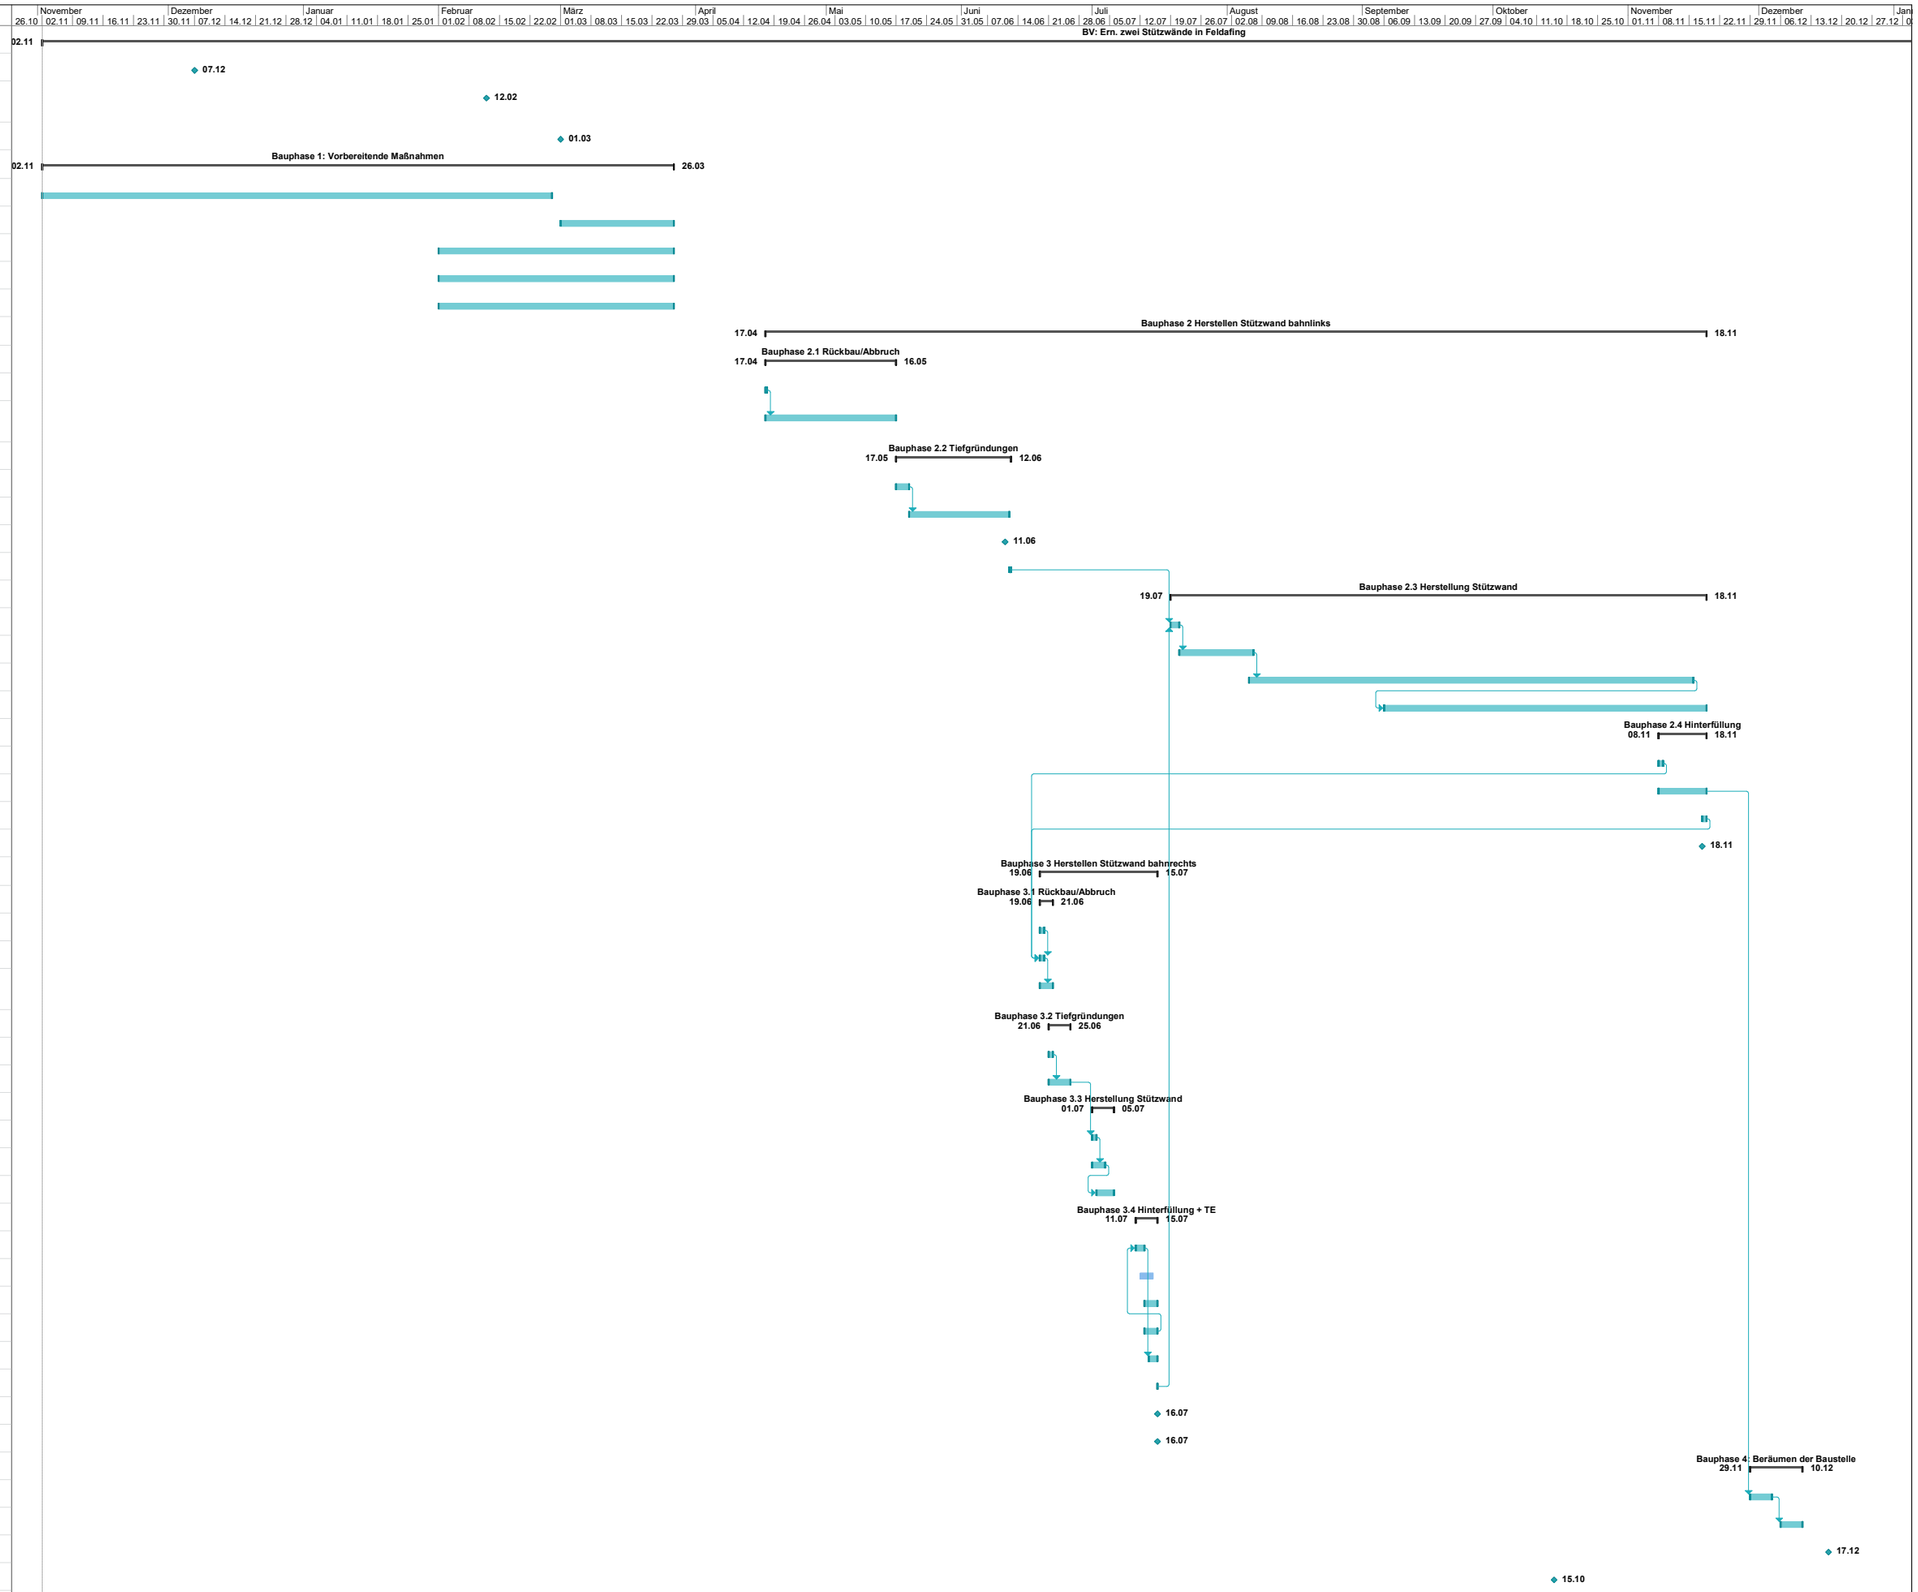

Projekt: msproj11
Datum: 03.09.2026

Vorgang | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Externer Meilenstein | Inaktiver Meilenstein | Manueller Vorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Anfang | Stichtag | Manueller Fortschritt
Unterbrechung | Sammelvorgang | Externe Vorgänge | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Ende | In Arbeit
