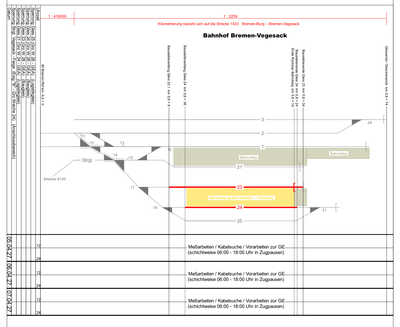

Baustellennr.:	124018 IB- und BK-Anmeldung 2027	Stand: 12.10.2026
Strecke:	1423 Bremen-Burg – Bremen-Vegesack	Bearbeiter: Hr. J. Schmitt (EPV-GIV mbH)
Baustelle:	Bahnhof Bremen-Vegesack Gleise 23 und 24	
Beschreibung:	Bahnhof Bremen-Vegesack Gleise 23 und 24 (Gleiserneuerungen mit Bettungserneuerung)	

Datum
Sperrung Strgl. Vegesack - Farge (Esig "B" - Grz Weiche 24) (Anschlussbereich)
Sperrung Gleis 21 (Grz W 24 - GEA) (Logistikgleis)
Sperrung Gleis 23 (Grz W 28 - GEA) (Baugleis)
Sperrung Gleis 24 (Grz W 28 - GEA) (Baugleis)
Sperrung Gleis 25 (Grz W 28 - GEA) (Logistikgleis)
Uhrzeit
1 : 418000
1 : 2259
Kilometrierung bezieht sich auf die Strecke 1423 Bremen-Burg – Bremen-Vegesack
Bahnhof Bremen-Vegesack
Bf Bremen Rbf km -5.0 + 0
Baustellenanfang Gleis 23.1 km 5.6 + 9
Baustellenanfang Gleis 24 km 5.6 + 36
Baustellenende Gleis 24 km 5.8 + 24
Ende Rückbau Bahnsteig km 5.8 + 19
Baustellenende Gleis 23 km 5.8 + 34
Gleisende / Streckenende km 5.9 + 74
3
2
1
21
23
24
25
11
10
13
14
15
16
17
18
21
24
Strgl.
Strecke 9145
Bahnsteig
Bahnsteig
Bahnsteig (außer Betrieb) --> Rückbau
05.04.27
06.04.27
07.04.27
Meßarbeiten / Kabelsuche / Vorarbeiten zur GE (schichtweise 06:00 - 18:00 Uhr in Zugpausen)
Meßarbeiten / Kabelsuche / Vorarbeiten zur GE (schichtweise 06:00 - 18:00 Uhr in Zugpausen)
Meßarbeiten / Kabelsuche / Vorarbeiten zur GE (schichtweise 06:00 - 18:00 Uhr in Zugpausen)
Mo. 12.04.2027
Sperrung Gleis 25 ab 10.04.2027 12:00 Uhr
Erneuerung Gleis 24 (Ver- / Entladung nach / von Gleis 25)
Gleissperrung / LST- Arbeiten / Ausschalten Oberleitung / Erdung OLA / Abbau OLA-Erden usw.
Di. 13.04.2027
Mi. 14.04.2027
Do. 15.04.2027
Fr. 16.04.2027
Oberbautechnische Abnahme / Aufheben Gleissperrung / LST- Arbeiten / OLA-Arbeiten / Abbau Erdung / Einschalten Oberleitung usw.
Gleis 24 bleibt weiter gesperrt (bis Ibn. Gleis 23 am 24.04.2027 05:00 Uhr).
Mo. 19.04.2027
Ausbau OLA-Brücken zwischen SG 1 und SG 701 (über Gleis 21) und zwischen SG 1 und SG 711 (über Gleis 23)
Gleissperrung / LST- Arbeiten / Ausschalten Oberleitung / Erdung OLA / Abbau OLA-Erden usw.
Di. 20.04.2027
Mi. 21.04.2027
Do. 22.04.2027
Fr. 23.04.2027
Sa. 24.04.2027
Einbau OLA-Brücken zwischen SG 1 und SG 701 (über Gleis 21) und zwischen SG 1 und SG 711 (über Gleis 23)
Oberbautechnische Abnahme / Aufheben Gleissperrung / LST- Arbeiten / OLA-Arbeiten / Abbau Erdung / Einschalten Oberleitung usw.
Sperrung Gleis 25 bis 24.04.2027 12:00 Uhr
09.06.27
10.06.27
Meßarbeiten für Belastungsstopfgang (schichtweise 06:00 - 18:00 Uhr in Zugpausen)
Meßarbeiten für Belastungsstopfgang (schichtweise 06:00 - 18:00 Uhr in Zugpausen)
Di. 15.06.2027
Mi. 16.06.2027
Sperrung Gleis 25 ab 15.06.2027 12:00 Uhr
Gleissperrung / LST- Arbeiten usw.
Gleis 23: Oberbautechnische Abnahme / Aufheben Gleissperrung / LST- Arbeiten usw.
Gleis 24: Oberbautechnische Abnahme / Aufheben Gleissperrung / LST- Arbeiten usw.
Do. 17.06.2027
Gleissperrung / LST- Arbeiten usw.
Oberbautechnische Abnahme / Aufheben Gleissperrung / LST- Arbeiten usw.
Oberbautechnische Abnahme / Aufheben Gleissperrung / LST- Arbeiten usw.
Sperrung Gleis 25 bis 17.06.2027 12:00 Uhr

erstellt mit SOG 7.2.1-17960

Name	Anzahl

Legende:

Fachdienste (Anfang)

Bahnhof Bremen-Vegesack
Gleise 23 und 24
Gleiserneuerungen mit Bettungserneuerung

Dieser Rahmenablaufplan gilt im Zuge der Ausschreibung nur als Anhaltspunkt, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit bzw. Richtigkeit der angesetzten Arbeiten, der vorgesehenen Maschinen, Maschinenreihenfolge, der angesetzten Auf- und Abrüstzeiten, bzw. der geplanten Arbeitsleistungen. Auf der Grundlage dieses Rahmenablaufplanes wurden die angemeldeten Sperrpausen ermittelt. Die genauen Sperrzeiten sind ausschließlich der für diese Baumaßnahmen gültigen Bau- und Betriebsanweisungen (Betra) zu entnehmen und können von den angemeldeten, in diesem Rahmenablaufplan vorgesehenen Sperrpausen abweichen.

Dieser Rahmenablaufplan ersetzt nicht den durch die Bieter / AN zu erstellenden und für die Bauausführung verbindlichen Bauablaufplan.

Baustellennr.:	124018 IB- und BK-Anmeldung 2027
Strecke:	1423 Bremen-Burg – Bremen-Vegesack
Baustelle:	Bahnhof Bremen-Vegesack Gleise 23 und 24

BS:
Bauüberwachung:
Bauleitung:
Auftrags-Kurznr.:
Oberbauanordung Alt: K - 49 - H - 1667
bzw. Weichenart/-form Neu: W - 49E5 - B 70 2.4 - 1538
Arbeitsverfahren:
Betriebsart:
Ausführung vom 12.04.2027 bis zum 17.06.2027
durch

Rahmenplan erstellt: J. Schmitt (EPV-GIV mbH)	Aufgestellt von:
Bearbeitungsvermerk des Unternehmers	Zugestimmt:
Bearbeitet	
Gezeichnet	
Geprüft	
Maßstab	
