



Rote Darstellung 01.03.27 08:00 Uhr – 05.03.27 21:00 Uhr, 109h, Weichenvormontage, W 67W08 (300r.), 67W06 (190r.), 67W015 (300r.), 016 (300r.),



Statt Gleis 25 neu Gl. 22

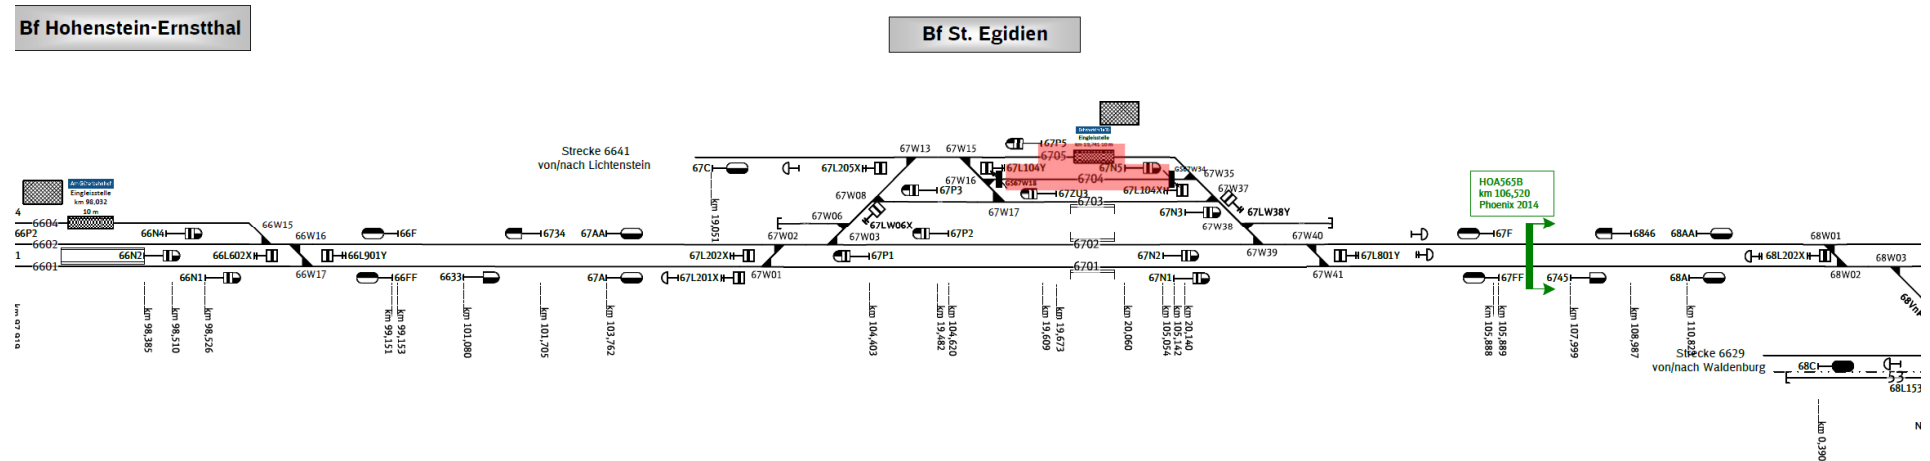

1.Ä. Lila Darstellung 03.03.27 08:00 Uhr – 15.03.27 16:00 Uhr, 296h, Logistikgleis

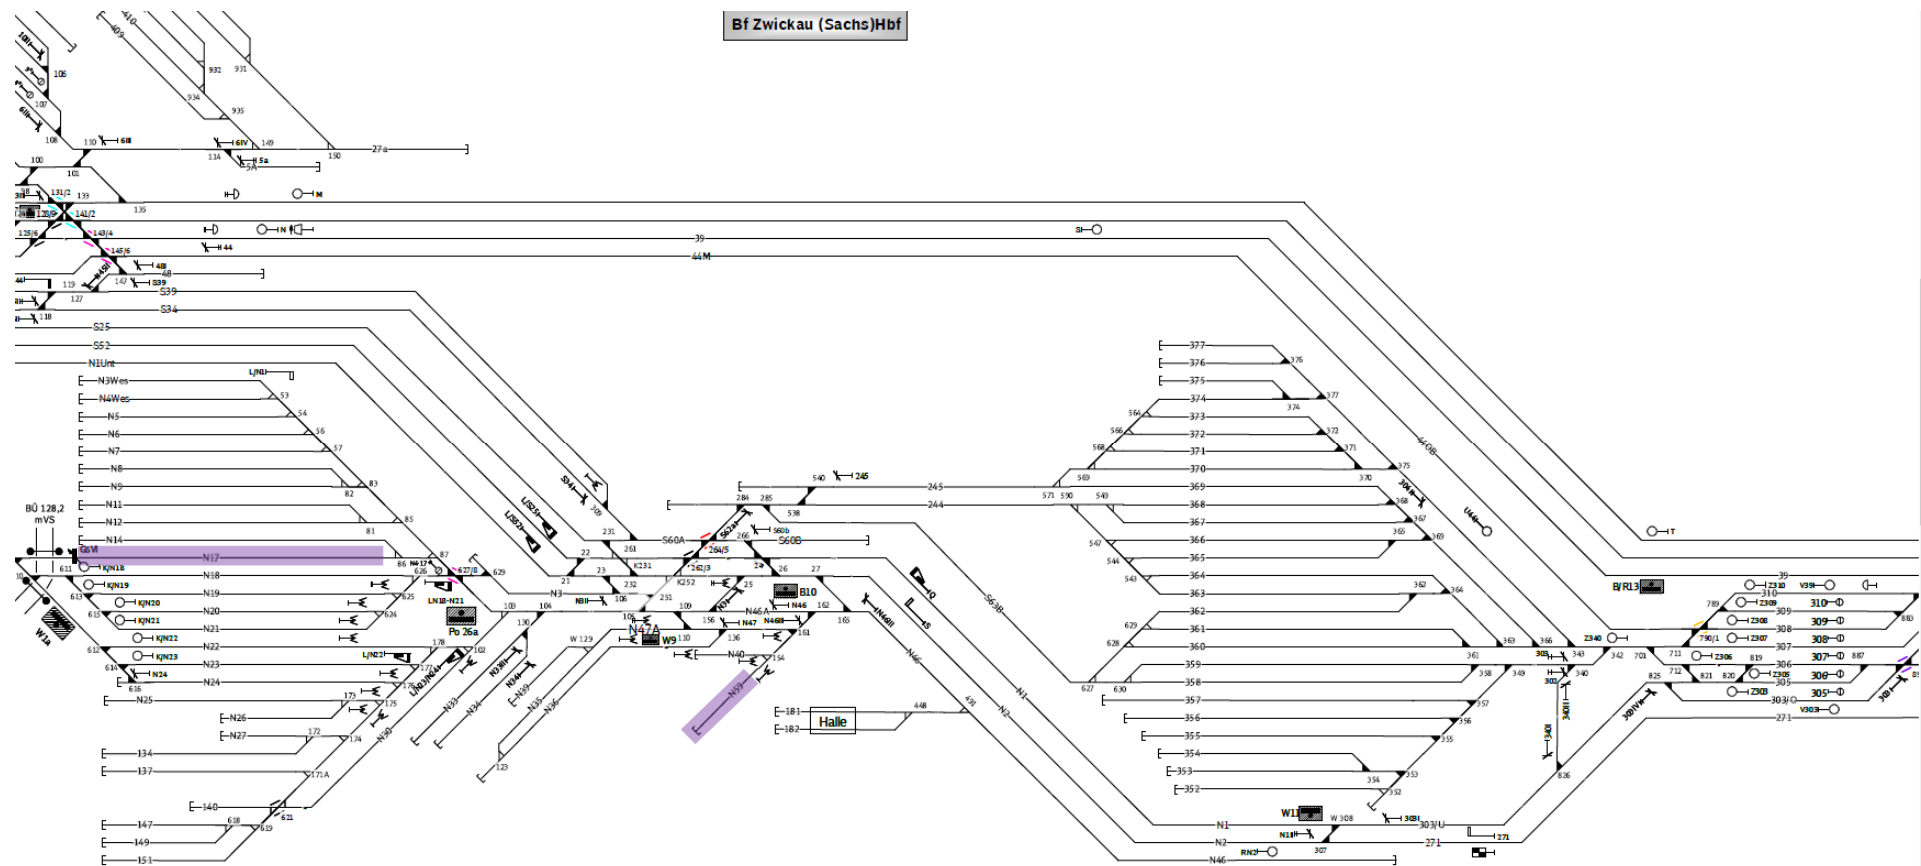


1.Ä. Lila Darstellung 05.03.27 21:00 Uhr – 15.03.27 16:00 Uhr, 235h, Logistikgleis

1.Ä. Rote Darstellung 05.03.27 21:00 Uhr – 15.03.27 04:00 Uhr, 223h, Sg 7, (Whz W1+W2 aus) WE W 67W08, 67W06, 67W015, 016, Aus- und Einbau der Eingleisstelle, Randweg herstellen, GE Wv W 13 - W8

blaue Darstellung 10.03.27 23:00 Uhr – 12.03.27 18:00 Uhr, 43h, Sg 3,1, WE W 67W06, Stopf und Schweißarb.

gelbe Darstellung stromloser Bereich im nicht gesperrten Gleisabschnitten 10.03.27 23:00 Uhr – 12.03.27 18:00 Uhr, 43h

10.03.27 23:00 Uhr – 12.03.27 18:00 Uhr GNT im Gleis 6701 ausgeschalten km 98,95 - km 105,80

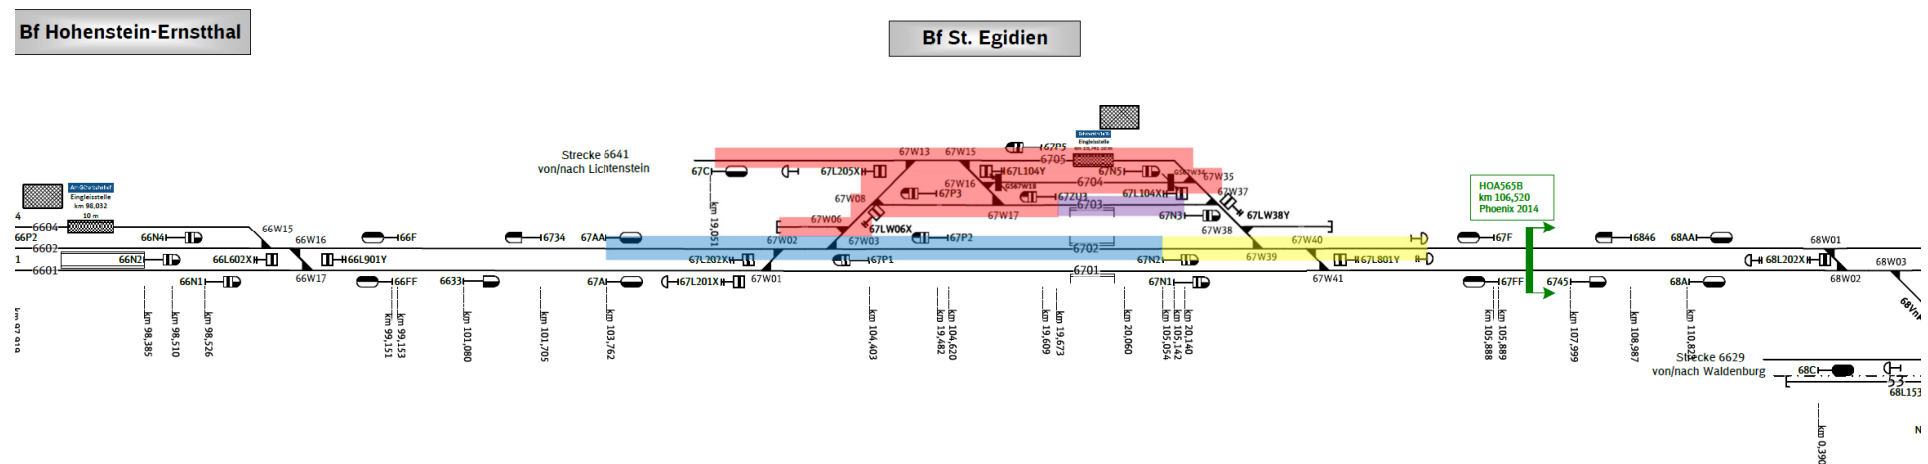

DUA und Schleifen voraussichtlich August 27, 2*8h DUA + 3*8h Schleifen, Anm. 396055
