



Lila Darstellung 14.05.2027 07:00 Uhr – 02.06.27 16:00 Uhr, 465h, Logistikgleis

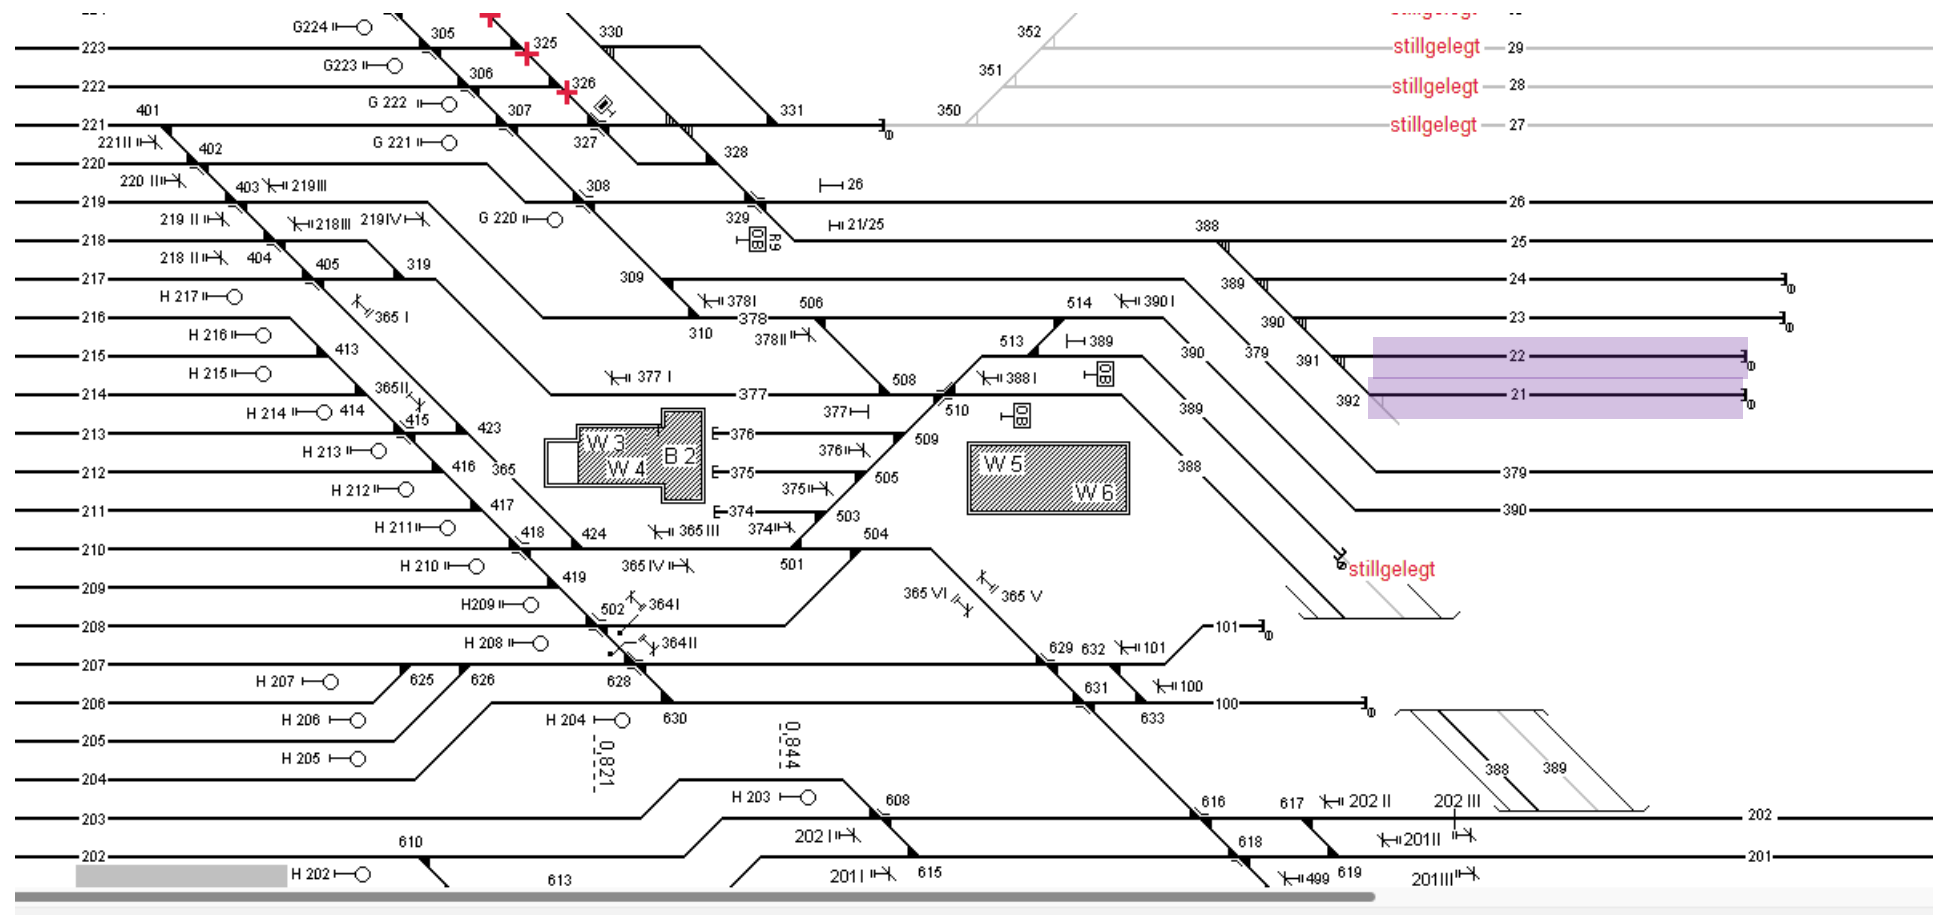


Lila Darstellung 14.05.27 07:00 Uhr – 11.06.27 16:00 Uhr, 465h, Logistikleise

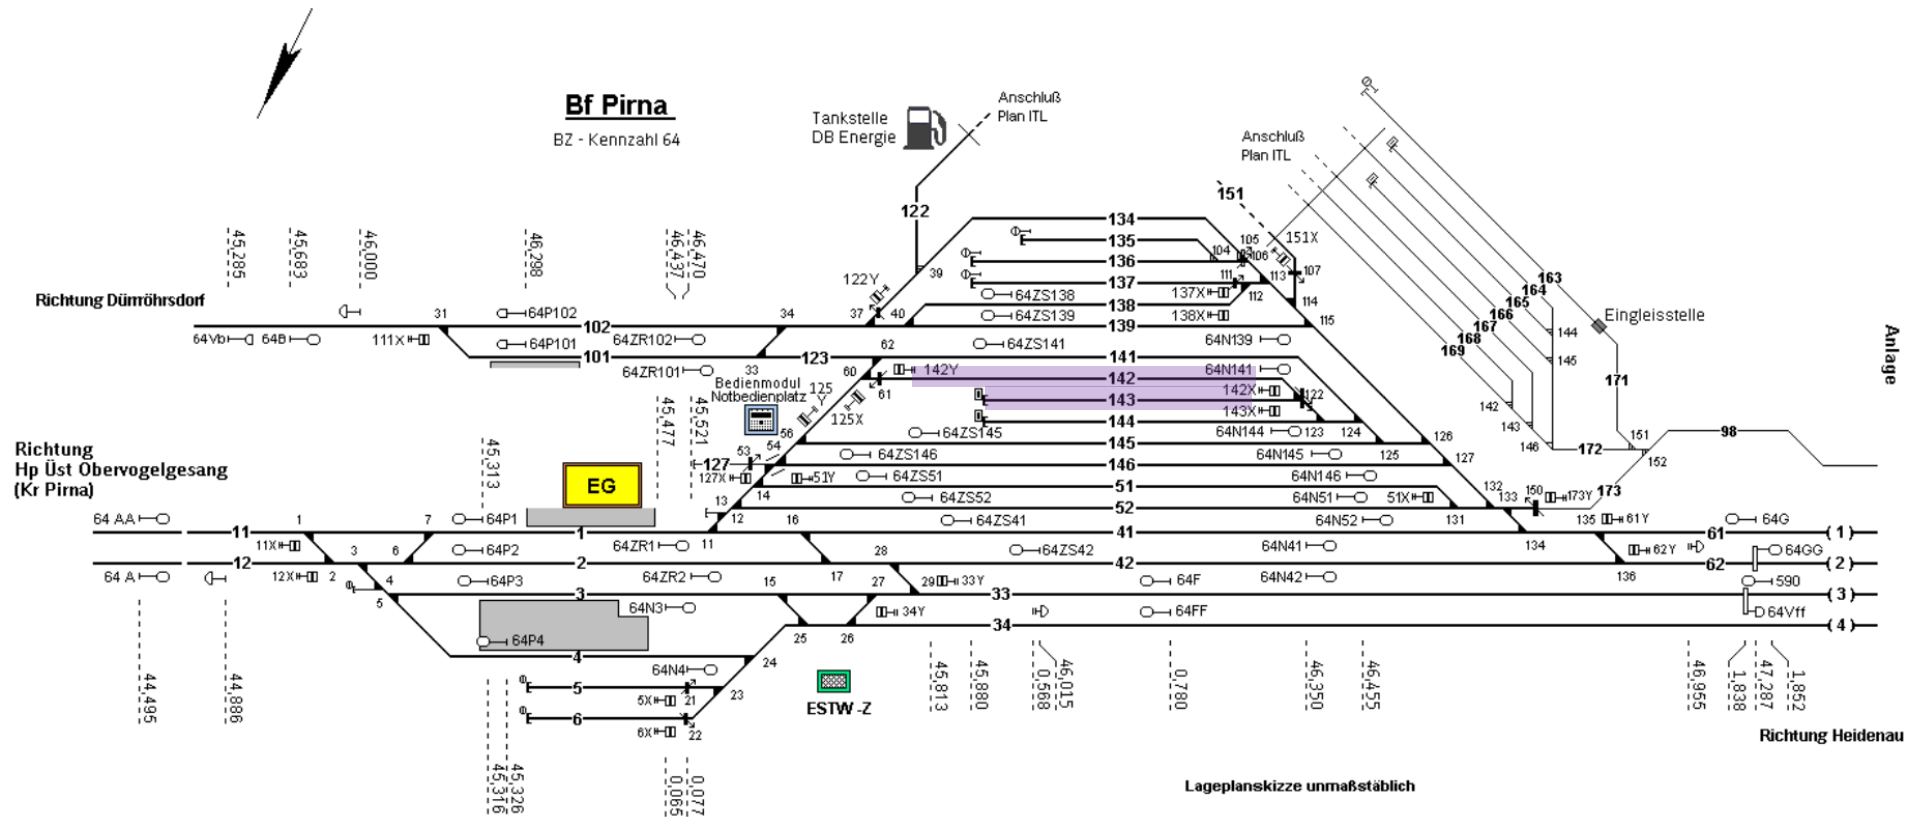

Lila Darstellung 18.05.2027 07:00 Uhr – 02.06.27 16:00 Uhr, 369h, Logistikgleis

Rote Darstellung 18.05.27 08:00 Uhr – 24.05.27 21:00 Uhr, 157h, Sg 27, Weichenvormontage W 12, 14, 3, 5

Gelbe Darstellung 18.05.27 08:00 Uhr – 24.05.27 21:00 Uhr, 157h stromloser Bereich in nicht gesperrten Gleisen

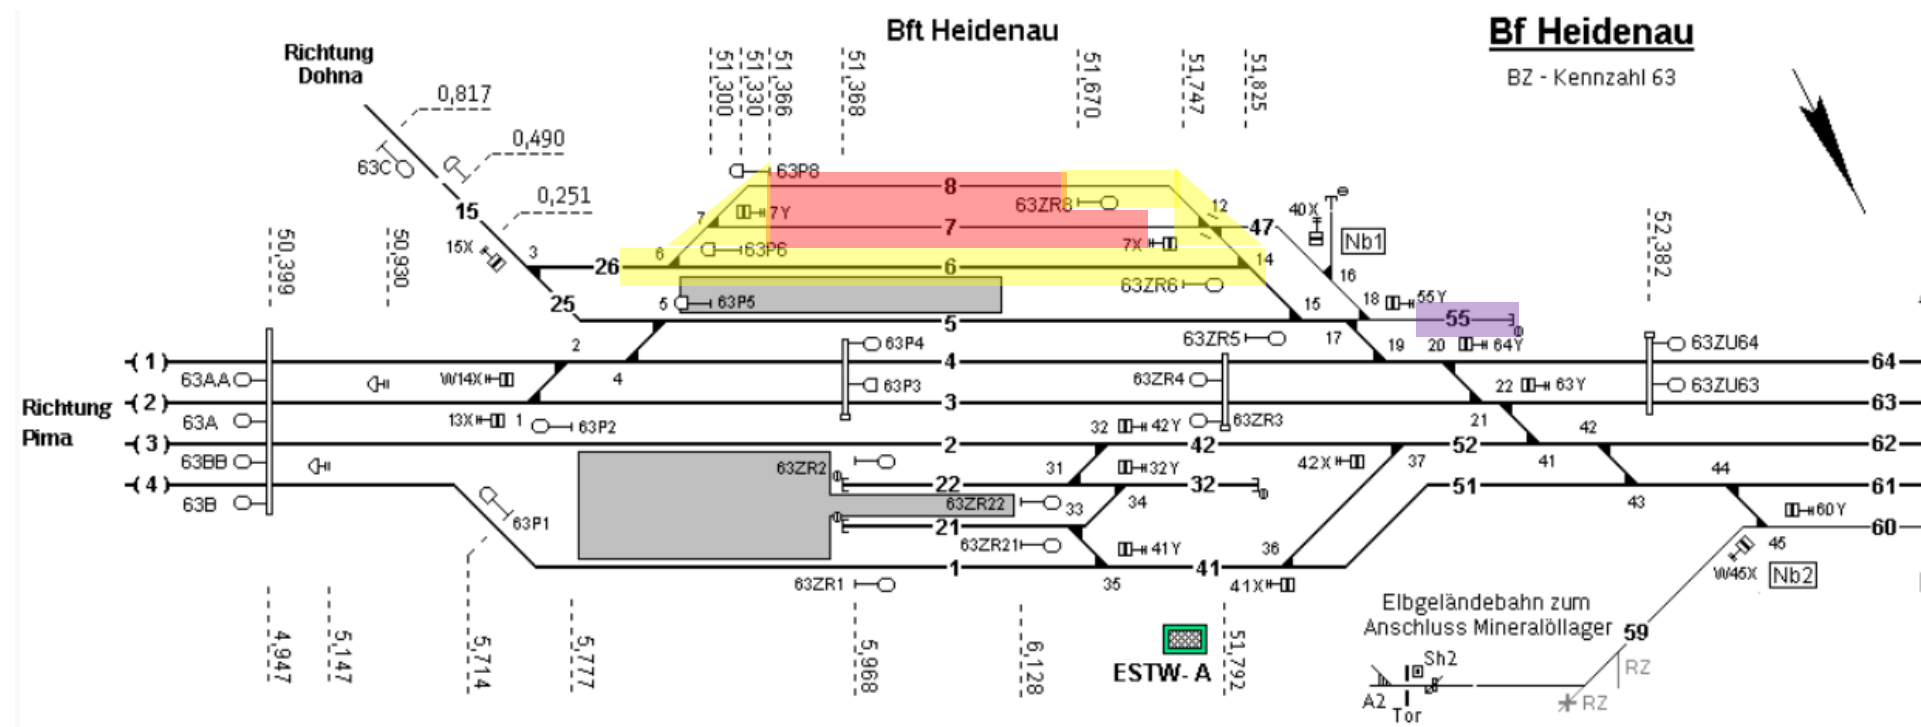


Lila Darstellung 18.05.2027 07:00 Uhr – 02.06.27 16:00 Uhr, 369h, Logistikgleis

Rote Darstellung 24.05.27 21:00 Uhr – 28.05.27 20:00 Uhr, 95h, Sg 27, Weichenerneuerung W 12 (DKW), 14

Gelbe Darstellung 24.05.27 21:00 Uhr – 28.05.27 20:00 Uhr stromloser Bereich in nicht gesperrten Gleisen


Blaue Darstellung 24./25.05.27 21:00 - 04:00, 7h, Sg 17, Aufbau Feste Absperrung zwischen Gleis 5, 6 ca. 300 m. Einbau Gleissperre zwischen W14/15

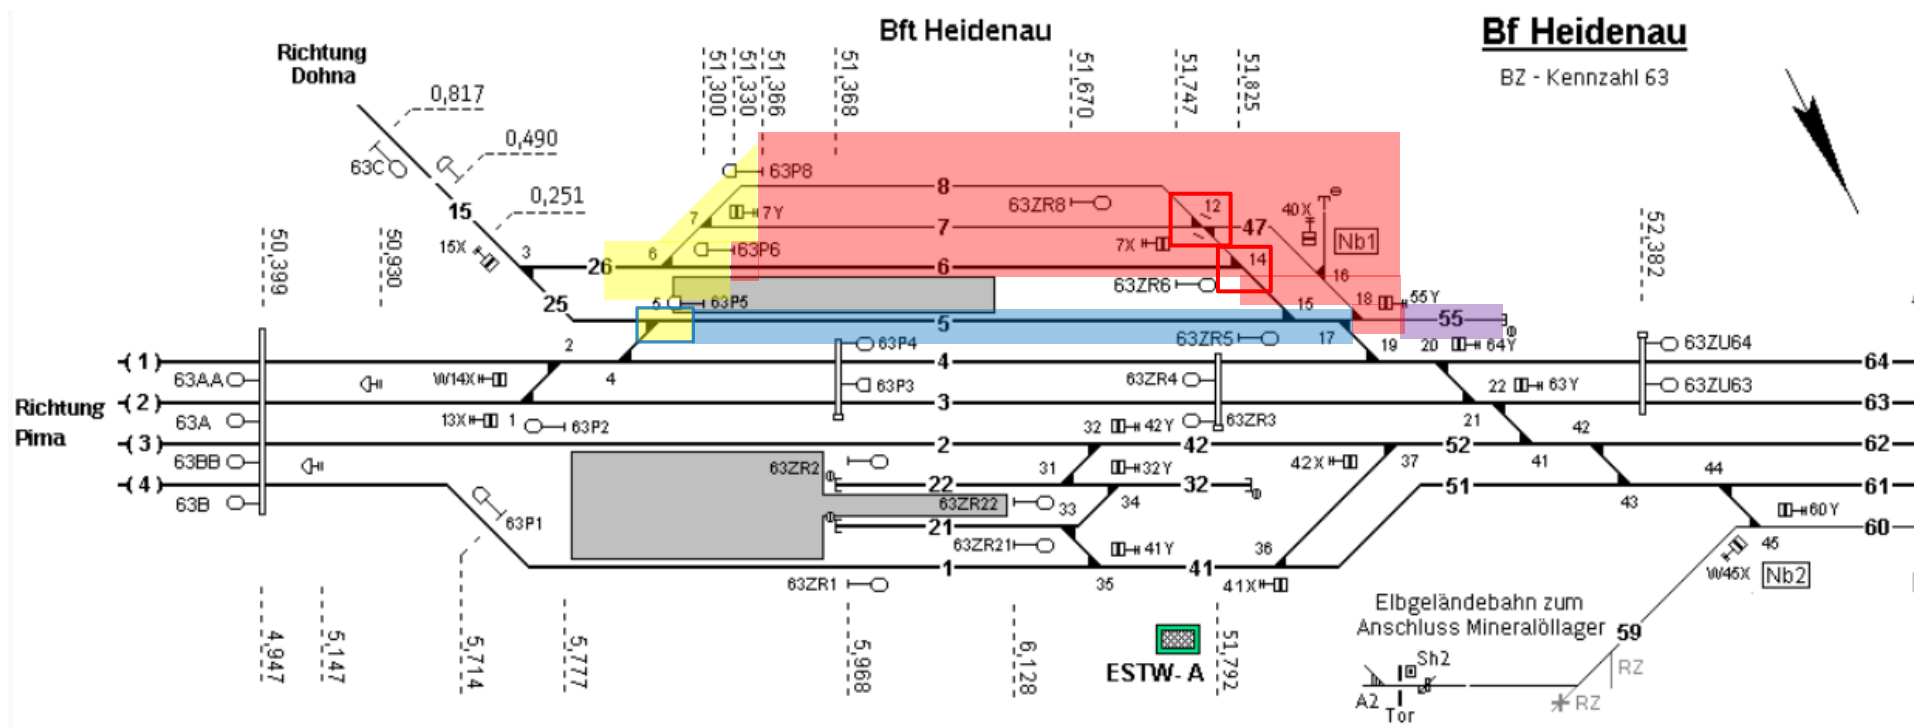

Lila Darstellung 18.05.2027 07:00 Uhr – 02.06.27 16:00 Uhr, 370h, Logistikleis

Rote Darstellung 24.05.27 21:00 Uhr – 28.05.27 20:00 Uhr, 95h, Sg 27, 17, Weichenerneuerung W 12 (DKW), 14 Sicherungsmaßnahme zur W 15 erforderlich

Gelbe Darstellung 24.05.27 21:00 Uhr – 28.05.27 20:00 Uhr stromloser Bereich in nicht gesperrten Gleisen

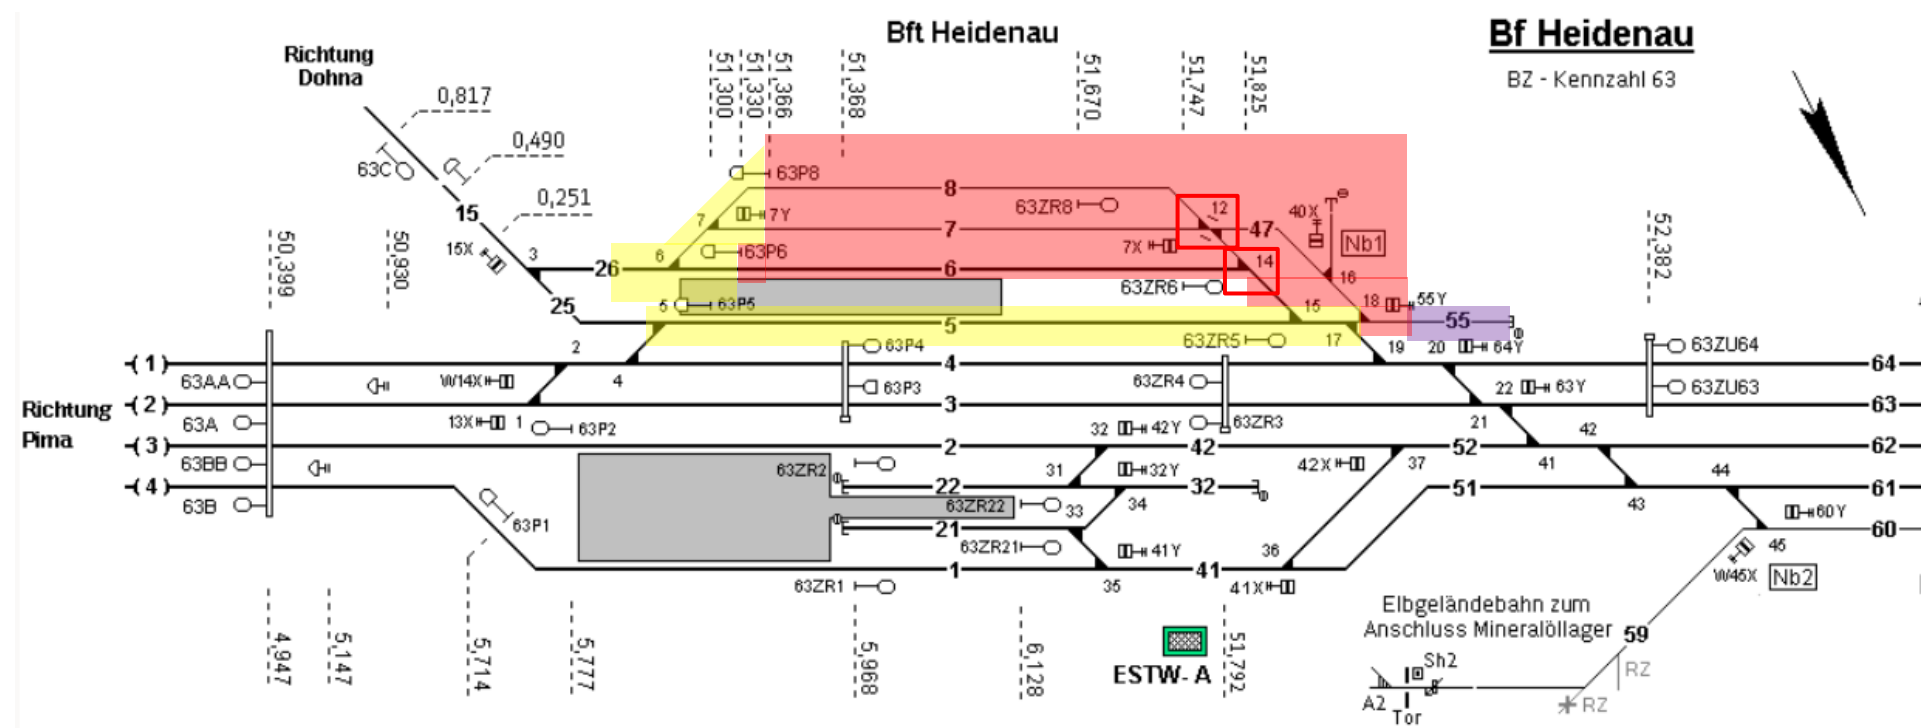

Lila Darstellung 18.05.2027 07:00 Uhr – 02.06.27 16:00 Uhr, 370h, Logistikgleis


Rote Darstellung 28.05.27 20:00 Uhr – 01.06.27 04:00 Uhr, 80 h, Sg 27, 17, Weichenerneuerung W 3, (5),

Blaue Darstellung 28./29.05.27 22:00 - 04:00, 6h, Sg 3, 403, 4, 404 Einbau Feste Absperrung zwischen Gleis 3, 4, und 4, 5, Ausbau Schienenstegdämpfer aus Gleis 3, 4

Schutz La 120 29.05.27 04:00 Uhr – 30.05.27 12:00 Uhr, im Gleis 4 von km 51,400 – 51,100, Grund Feste Absperrung, Gleisabstand 4 m

Schutz La 120 29.05.27 04:00 Uhr – 31.05.27 23:00 Uhr, im Gleis 3 von km 51,100 – 51,400, Grund Feste Absperrung, Gleisabstand 4 m

28.05.27 20:00 Uhr – 01.06.27 04:00 Uhr Anschluss Fluorchemie Dohna GmbH ist nicht bedienbar.

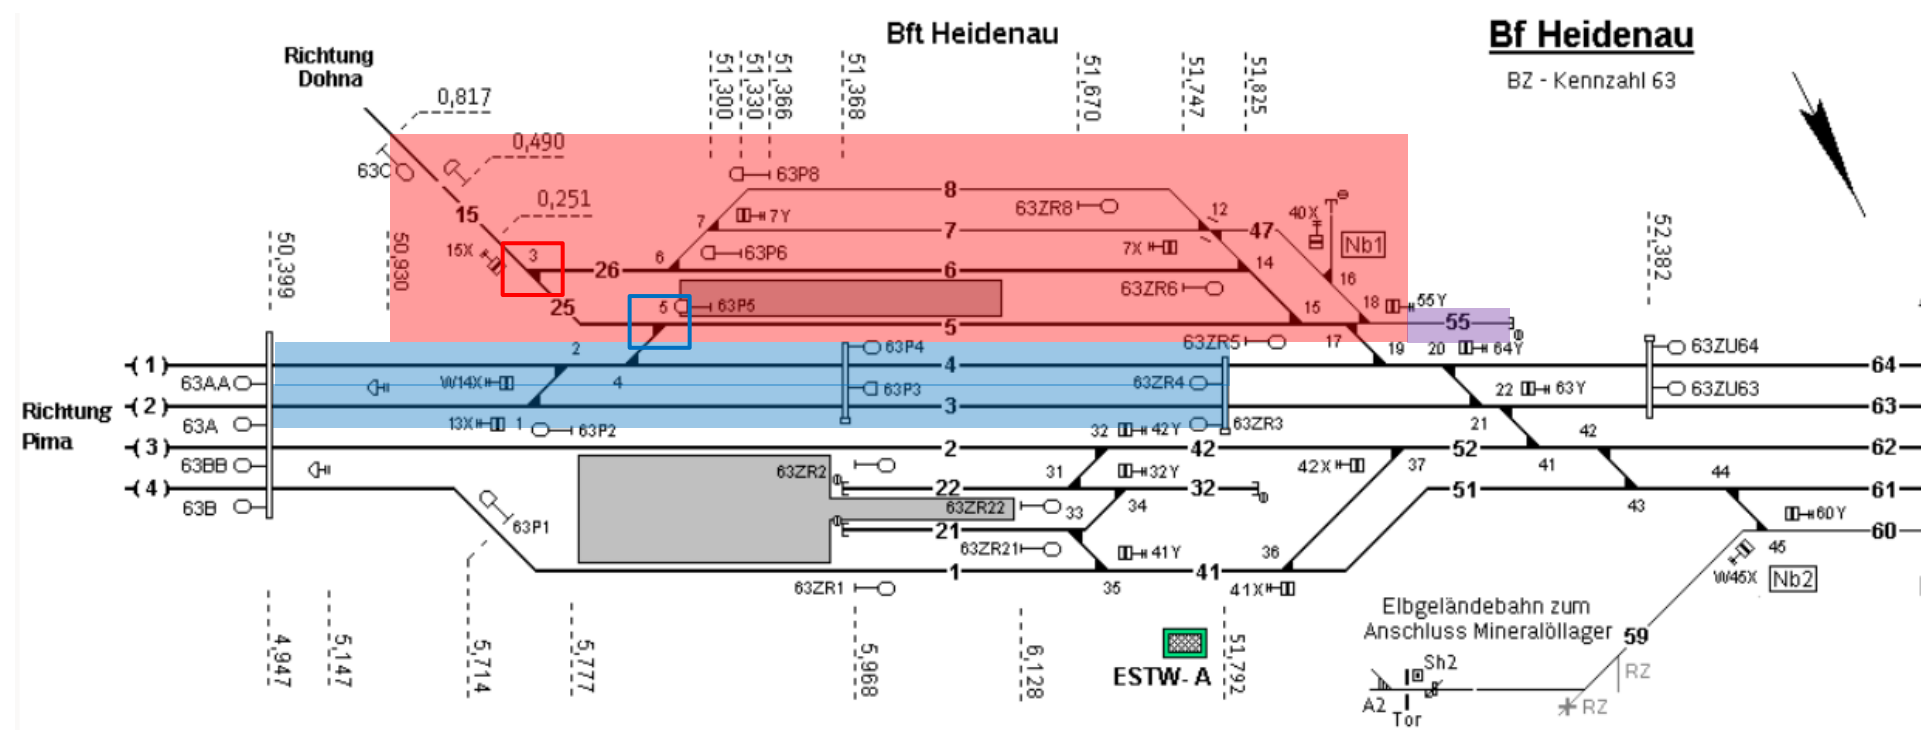

Lila Darstellung 18.05.2027 07:00 Uhr – 02.06.27 16:00 Uhr, 370h, Logistikgleis

Rote Darstellung 28.05.27 20:00 Uhr – 01.06.27 04:00 Uhr, 80h, Sg 27, 17, Weichenerneuerung W 12, 14, 3, (5), ggf. mit PSS

Blaue Darstellung 30.05.27 12:00 - 01.06.27 04:00, 40h, Sg 3, 403, Weichenerneuerung W 5

Grüne Darstellung 31.05./01.06.27 23:00 Uhr – 04:00 Uhr, Sg 4, 404, Abbau Feste Absperrung, Einbau Schienenstegdämpfer Gl. 3, 4

Schutz La 120 29.05.27 04:00 Uhr – 30.05.27 12:00 Uhr, im Gleis 4 von km 51,400 – 51,100, Grund Feste Absperrung, Gleisabstand 4 m

Schutz La 120 29.05.27 04:00 Uhr – 31.05.27 23:00 Uhr, im Gleis 3 von km 51,100 – 51,400, Grund Feste Absperrung, Gleisabstand 4 m

