
Baubetriebsplan

Auszug aus dem Baubetriebsplan 02.04.2027 - 23.05.2027; 2 Strecken

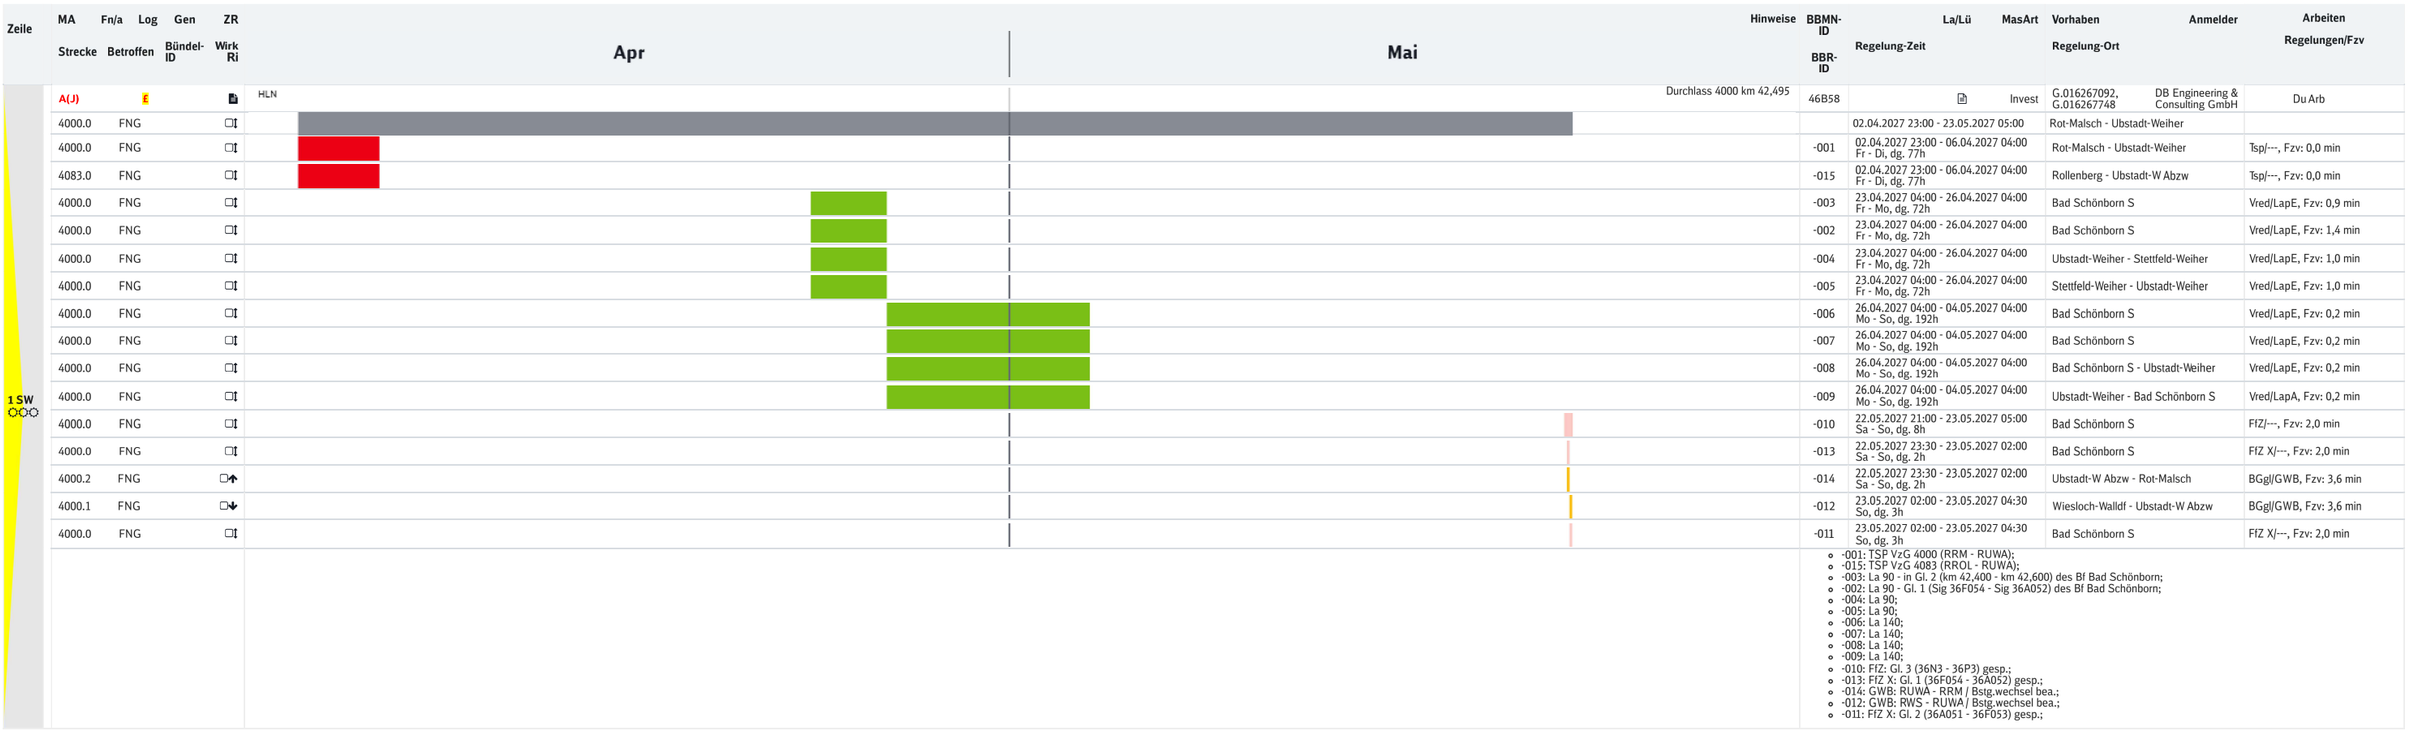

Zeile	MA / Strecke	Fn/a / Betroffen	Log / Bündel-ID	Gen / Wirk Ri	ZR	Hinweise	BBMN-ID / BBR-ID	La/Lü / Regelung-Zeit	MasArt	Vorhaben / Regelung-Ort	Anmelder	Arbeiten / Regelungen/Fzv
	A(J)	E				Durchlass 4000 km 42,495	46B58		Invest	G.016267092, G.016267748	DB Engineering & Consulting GmbH	Du Arb
	4000.0	FNG						02.04.2027 23:00 - 23.05.2027 05:00		Rot-Malsch - Ubstadt-Weiher		
	4000.0	FNG					-001	02.04.2027 23:00 - 06.04.2027 04:00 Fr - Di, dg. 77h		Rot-Malsch - Ubstadt-Weiher		Tsp/---, Fzv: 0,0 min
	4083.0	FNG					-015	02.04.2027 23:00 - 06.04.2027 04:00 Fr - Di, dg. 77h		Rollenberg - Ubstadt-W Abzw		Tsp/---, Fzv: 0,0 min
	4000.0	FNG					-003	23.04.2027 04:00 - 26.04.2027 04:00 Fr - Mo, dg. 72h		Bad Schönborn S		Vred/LapE, Fzv: 0,9 min
	4000.0	FNG					-002	23.04.2027 04:00 - 26.04.2027 04:00 Fr - Mo, dg. 72h		Bad Schönborn S		Vred/LapE, Fzv: 1,4 min
	4000.0	FNG					-004	23.04.2027 04:00 - 26.04.2027 04:00 Fr - Mo, dg. 72h		Ubstadt-Weiher - Stettfeld-Weiher		Vred/LapE, Fzv: 1,0 min
	4000.0	FNG					-005	23.04.2027 04:00 - 26.04.2027 04:00 Fr - Mo, dg. 72h		Stettfeld-Weiher - Ubstadt-Weiher		Vred/LapE, Fzv: 1,0 min
	4000.0	FNG					-006	26.04.2027 04:00 - 04.05.2027 04:00 Mo - So, dg. 192h		Bad Schönborn S		Vred/LapE, Fzv: 0,2 min
	4000.0	FNG					-007	26.04.2027 04:00 - 04.05.2027 04:00 Mo - So, dg. 192h		Bad Schönborn S		Vred/LapE, Fzv: 0,2 min
	4000.0	FNG					-008	26.04.2027 04:00 - 04.05.2027 04:00 Mo - So, dg. 192h		Bad Schönborn S - Ubstadt-Weiher		Vred/LapE, Fzv: 0,2 min
	4000.0	FNG					-009	26.04.2027 04:00 - 04.05.2027 04:00 Mo - So, dg. 192h		Ubstadt-Weiher - Bad Schönborn S		Vred/LapA, Fzv: 0,2 min
	4000.0	FNG					-010	22.05.2027 21:00 - 23.05.2027 05:00 Sa - So, dg. 8h		Bad Schönborn S		FfZ/---, Fzv: 2,0 min
	4000.0	FNG					-013	22.05.2027 23:30 - 23.05.2027 02:00 Sa - So, dg. 2h		Bad Schönborn S		FfZ X/---, Fzv: 2,0 min
	4000.2	FNG					-014	22.05.2027 23:30 - 23.05.2027 02:00 Sa - So, dg. 2h		Ubstadt-W Abzw - Rot-Malsch		BGgl/GWB, Fzv: 3,6 min
	4000.1	FNG					-012	23.05.2027 02:00 - 23.05.2027 04:30 So, dg. 3h		Wiesloch-Walldf - Ubstadt-W Abzw		BGgl/GWB, Fzv: 3,6 min
	4000.0	FNG					-011	23.05.2027 02:00 - 23.05.2027 04:30 So, dg. 3h		Bad Schönborn S		FfZ X/---, Fzv: 2,0 min

- -001: TSP VzG 4000 (RRM - RUWA);
- -015: TSP VzG 4083 (RROL - RUWA);
- -003: La 90 - in Gl. 2 (km 42,400 - km 42,600) des Bf Bad Schönborn;
- -002: La 90 - Gl. 1 (Sig 36F054 - Sig 36A052) des Bf Bad Schönborn;
- -004: La 90;
- -005: La 90;
- -006: La 140;
- -007: La 140;
- -008: La 140;
- -009: La 140;
- -010: FfZ: Gl. 3 (36N3 - 36P3) gesp.;
- -013: FfZ X: Gl. 1 (36F054 - 36A052) gesp.;
- -014: GWB: RUWA - RRM / Bstg.wechsel bea.;
- -012: GWB: RWS - RUWA / Bstg.wechsel bea.;
- -011: FfZ X: Gl. 2 (36A051 - 36F053) gesp.;

Stand: 04.08.2026, 07:14

Liste der Baumaßnahmen mit Anforderung einer baubetrieblichen Zugregelung, Baubetriebsplan 02.04.2027 - 23.05.2027

Lfd.№	BBMN-Kennung BBR-ID BBMN-Titel	QS-/KS-№ Korridor Bündel-ID 'KiGbau'-№	VzG-Str	Streckenabschnitt	Art der Arbeiten Projekt-№ fin. MN-Art	Zeitraum BBR	Baubetr. Regelung	bVE	Information APS/IAV	betr.Verk. Betra LÜ SK	Bemerkungen regionale KBB	Apr.	Mai
1	A(J) 46B58-001 Durchlass 4000 km 42,495		4000.0	Rot-Malsch - Ubstadt-Weiher	G.016267092, G.016267748 Investive Maßnahme	Fr, 02.04.2027, 23:00 Uhr - Di, 06.04.2027, 04:00 Uhr, 77h	Tsp Fzv(KBB): 0,0	VE: TSP, VzG 4000 RUW Gleis 322, Hauptsignal 36331 - RBS Gleis 001 ... A051; Aussch. OL SG 1+2 + Freie Strecke RUW-RBS + RBS-RUW		SGV, SPFV, SPNV	BBR-Bem.: TSP VzG 4000 (RRM - RUWA)		
2	A(J) 46B58-015 Durchlass 4000 km 42,495		4083.0	Rollenberg - Ubstadt-W Abzw	G.016267092, G.016267748 Investive Maßnahme	Fr, 02.04.2027, 23:00 Uhr - Di, 06.04.2027, 04:00 Uhr, 77h	Tsp Fzv(KBB): 0,0	VE: TSP, VzG 4000 RUW Gleis 322, Hauptsignal 36331 - RBS Gleis 001 ... A051; Aussch. OL SG 1+2 + Freie Strecke RUW-RBS + RBS-RUW		SGV, SPFV, SPNV	BBR-Bem.: TSP VzG 4083 (RROL - RUWA)		
3	A(J) 46B58-002 Durchlass 4000 km 42,495		4000.0	Bad Schönborn S - Bad Schönborn S	G.016267092, G.016267748 Investive Maßnahme	Fr, 23.04.2027, 04:00 Uhr - Mo, 26.04.2027, 04:00 Uhr, 72h	Vred, Langsamfahrt per La-Eintrag 160 / 90 Fzv(KBB): 1,4	VE: La, VzG 4000 RBS Gleis 001, Gleis 3601, Hauptsignal 36F054 - Hauptsignal 36A052		SGV, SPFV, SPNV	BBR-Bem.: La 90 - Gl. 1 (Sig 36F054 - Sig 36A052) des Bf Bad Schönborn		
4	A(J) 46B58-003 Durchlass 4000 km 42,495		4000.0	Bad Schönborn S - Bad Schönborn S	G.016267092, G.016267748 Investive Maßnahme	Fr, 23.04.2027, 04:00 Uhr - Mo, 26.04.2027, 04:00 Uhr, 72h	Vred, Langsamfahrt per La-Eintrag 160 / 90 Fzv(KBB): 0,9	VE: La, VzG 4000 RBS Gleis 3602, km42,400 - km42,600		SGV, SPFV, SPNV	BBR-Bem.: La 90 - in Gl. 2 (km 42,400 - km 42,600) des Bf Bad Schönborn		
5	A(J) 46B58-004 Durchlass 4000 km 42,495		4000.0	Ubstadt-Weiher - Stettfeld-Weiher	G.016267092, G.016267748 Investive Maßnahme	Fr, 23.04.2027, 04:00 Uhr - Mo, 26.04.2027, 04:00 Uhr, 72h	Vred, Langsamfahrt per La-Eintrag 160 / 90 Fzv(KBB): 1,0	VE: La, VzG 4000 RSFW Gleis 320, km44,200 - R319H, km44,700		SGV, SPFV, SPNV	BBR-Bem.: La 90		
6	A(J) 46B58-005 Durchlass 4000 km 42,495		4000.0	Stettfeld-Weiher - Ubstadt-Weiher	G.016267092, G.016267748 Investive Maßnahme	Fr, 23.04.2027, 04:00 Uhr - Mo, 26.04.2027, 04:00 Uhr, 72h	Vred, Langsamfahrt per La-Eintrag 160 / 90 Fzv(KBB): 1,0	VE: La, VzG 4000 RSFW Gleis 017, km44,200 - R319H Gleis 319, km44,700		SGV, SPFV, SPNV	BBR-Bem.: La 90		
7	A(J) 46B58-006 Durchlass 4000 km 42,495		4000.0	Bad Schönborn S - Bad Schönborn S	G.016267092, G.016267748 Investive Maßnahme	Mo, 26.04.2027, 04:00 Uhr - Di, 04.05.2027, 04:00 Uhr, 192h	Vred, Langsamfahrt per La-Eintrag 160 / 140 Fzv(KBB): 0,2	VE: La, VzG 4000 RBS Gleis 001, km42,600 - km42,400		SGV, SPFV, SPNV	BBR-Bem.: La 140		
8	A(J) 46B58-007 Durchlass 4000 km 42,495		4000.0	Bad Schönborn S - Bad Schönborn S	G.016267092, G.016267748 Investive Maßnahme	Mo, 26.04.2027, 04:00 Uhr - Di, 04.05.2027, 04:00 Uhr, 192h	Vred, Langsamfahrt per La-Eintrag 160 / 140 Fzv(KBB): 0,2	VE: La, VzG 4000 RBS Gleis 3602, km42,400 - km42,600		SGV, SPFV, SPNV	BBR-Bem.: La 140		
9	A(J) 46B58-008 Durchlass 4000 km 42,495		4000.0	Bad Schönborn S - Ubstadt-Weiher	G.016267092, G.016267748 Investive Maßnahme	Mo, 26.04.2027, 04:00 Uhr - Di, 04.05.2027, 04:00 Uhr, 192h	Vred, Langsamfahrt per La-Eintrag 160 / 140 Fzv(KBB): 0,2	VE: La, VzG 4000 RSFW Gleis 017, km44,200 - R319H Gleis 319, km44,700		SGV, SPFV, SPNV	BBR-Bem.: La 140		
10	A(J) 46B58-009 Durchlass 4000 km 42,495		4000.0	Ubstadt-Weiher - Bad Schönborn S	G.016267092, G.016267748 Investive Maßnahme	Mo, 26.04.2027, 04:00 Uhr - Di, 04.05.2027, 04:00 Uhr, 192h	Vred, Langsamfahrt per LZB / ETCS Auftrag 160 / 140 Fzv(KBB): 0,2	VE: La, VzG 4000 RSFW Gleis 320, km44,200 - R319H, km44,700		SGV, SPFV, SPNV	BBR-Bem.: La 140		
11	A(J) 46B58-010 Durchlass 4000 km 42,495		4000.0	Bad Schönborn S - Bad Schönborn S	G.016267092, G.016267748 Investive Maßnahme	Sa, 22.05.2027, 21:00 Uhr - So, 23.05.2027, 05:00 Uhr, 8h	FIZ Fzv(KBB): 2,0	VE: Sp Hgl, VzG 4000 RBS Gleis 3603, km42,175 - Hauptsignal 36N3		SGV, SPFV, SPNV	BBR-Bem.: FIZ: Gl. 3 (36N3 - 36P3) gesp.		
12	A(J) 46B58-013 Durchlass 4000 km 42,495		4000.0	Bad Schönborn S - Bad Schönborn S	G.016267092, G.016267748 Investive Maßnahme	Sa, 22.05.2027, 23:30 Uhr - So, 23.05.2027, 02:00 Uhr, 2h	FIZ X Fzv(KBB): 2,0	VE: Sp dg Hgl, VzG 4000 RUW Gleis 322, Hauptsignal 36331 - RBS Gleis 001, Gleis 3601, Hauptsignal 36A052		SGV, SPFV, SPNV	BBR-Bem.: FIZ X: Gl. 1 (36F054 - 36A052) gesp.		
13	A(J) 46B58-014 Durchlass 4000 km 42,495		4000.2	Ubstadt-W Abzw - Rot-Malsch	G.016267092, G.016267748 Investive Maßnahme	Sa, 22.05.2027, 23:30 Uhr - So, 23.05.2027, 02:00 Uhr, 2h	BGgl, Gleiswechselbetrieb ständig eingerichtet Fzv(KBB): 3,6	VE: Sp dg Hgl, VzG 4000 RUW Gleis 322, Hauptsignal 36331 - RBS Gleis 001, Gleis 3601, Hauptsignal 36A052		SGV, SPFV, SPNV	BBR-Bem.: GWB: RUWA - RRM / Bstg.wechsel bea.		

Lfd.№	BBMN- Kennung BBR-ID BBMN-Titel	QS-/KS-№ Korridor Bündel-ID 'KiGbau'-№	VzG-Str	Streckenabschnitt	Art der Arbeiten Projekt-№ fin. MN-Art	Zeitraum BBR	Baubetr. Regelung	bVE	Information APS/IAV	betr.Verk. Betra LÜ SK	Bemerkungen regionale KBB	Apr.	Mai
14	A(J) 46B58-011 Durchlass 4000 km 42,495		4000.0	Bad Schönborn S - Bad Schönborn S	G.016267092, G.016267748 Investive Maßnahme	So, 23.05.2027, 02:00 Uhr - 04:30 Uhr, 3h	FfZ X Fzv(KBB): 2,0	VE: Sp dg Hgl, VzG 4000 RBS Gleis 002, Gleis 3602, Hauptsignal 36A051 - RUW Gleis 319, Hauptsignal 36321		SGV, SPFV, SPNV	BBR-Bem.: FfZ X: Gl. 2 (36A051 - 36F053) gesp.		
15	A(J) 46B58-012 Durchlass 4000 km 42,495		4000.1	Wiesloch-Walldf - Ubstadt-W Abzw	G.016267092, G.016267748 Investive Maßnahme	So, 23.05.2027, 02:00 Uhr - 04:30 Uhr, 3h	BGgl, Gleiswechselbetr ieb ständig eingerichtet Fzv(KBB): 3,6	VE: Sp dg Hgl, VzG 4000 RBS Gleis 002, Gleis 3602, Hauptsignal 36A051 - RUW Gleis 319, Hauptsignal 36321		SGV, SPFV, SPNV	BBR-Bem.: GWB: RWS - RUWA / Bstg.wechsel bea.		
