

**Lila Darstellung 12.05.27 07:00 Uhr – 21.05.27 16:00 Uhr**, Logistikgleise, Materialbereitstellung Schotter, Gl. 33, 32, 29, 35

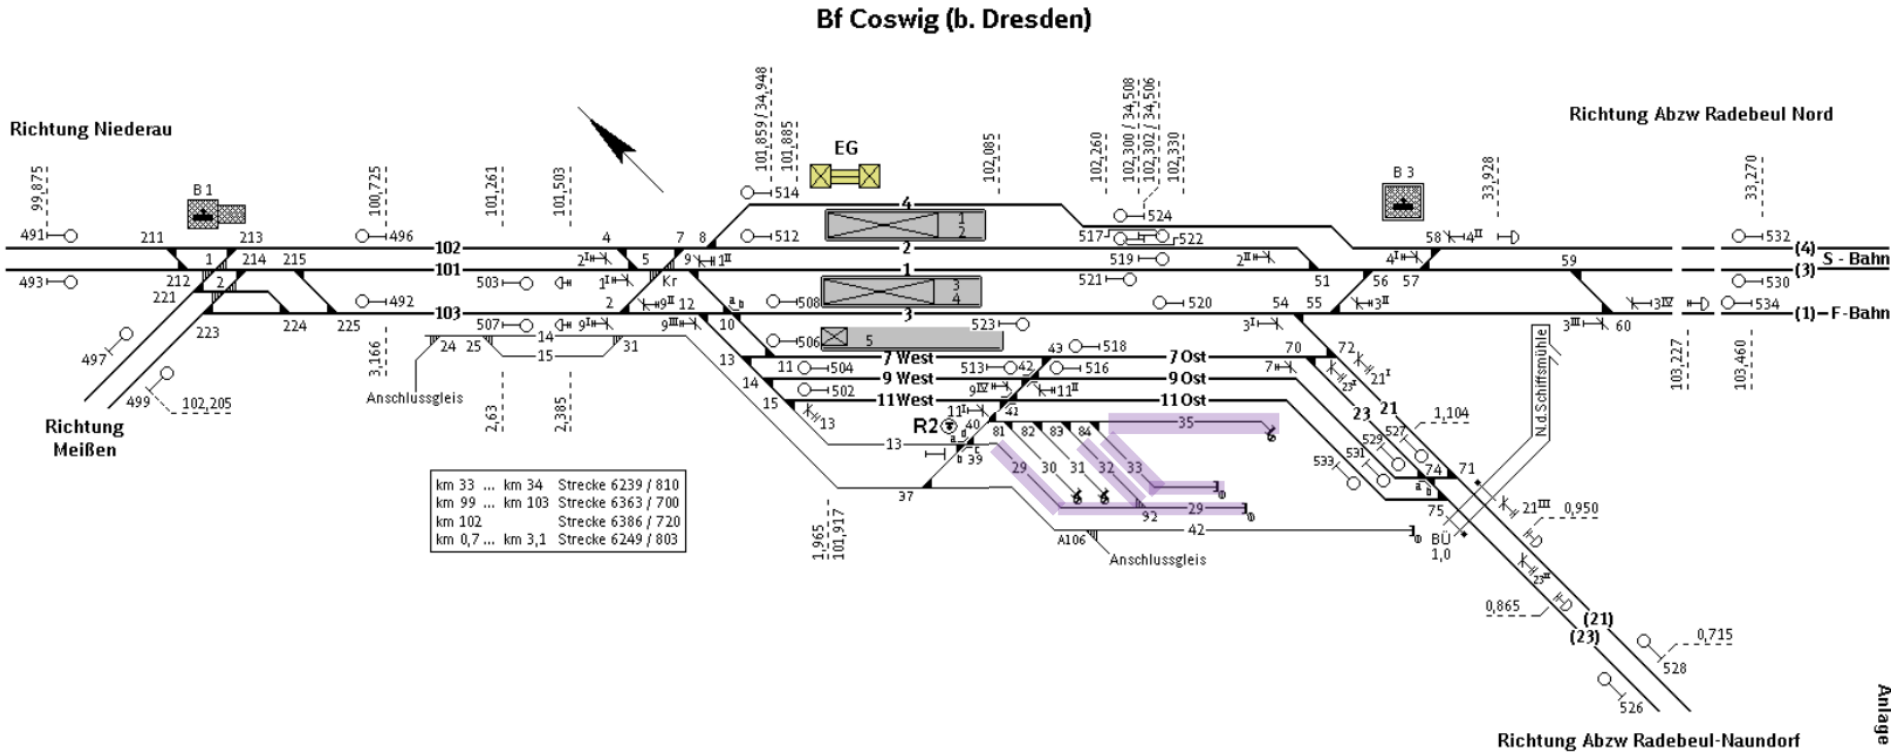

**Rote Darstellung 12.05.27 08:00 Uhr – 18.05.27 22:00 Uhr**, Vormontage W 35, Einbau neuer Gleisabschluss

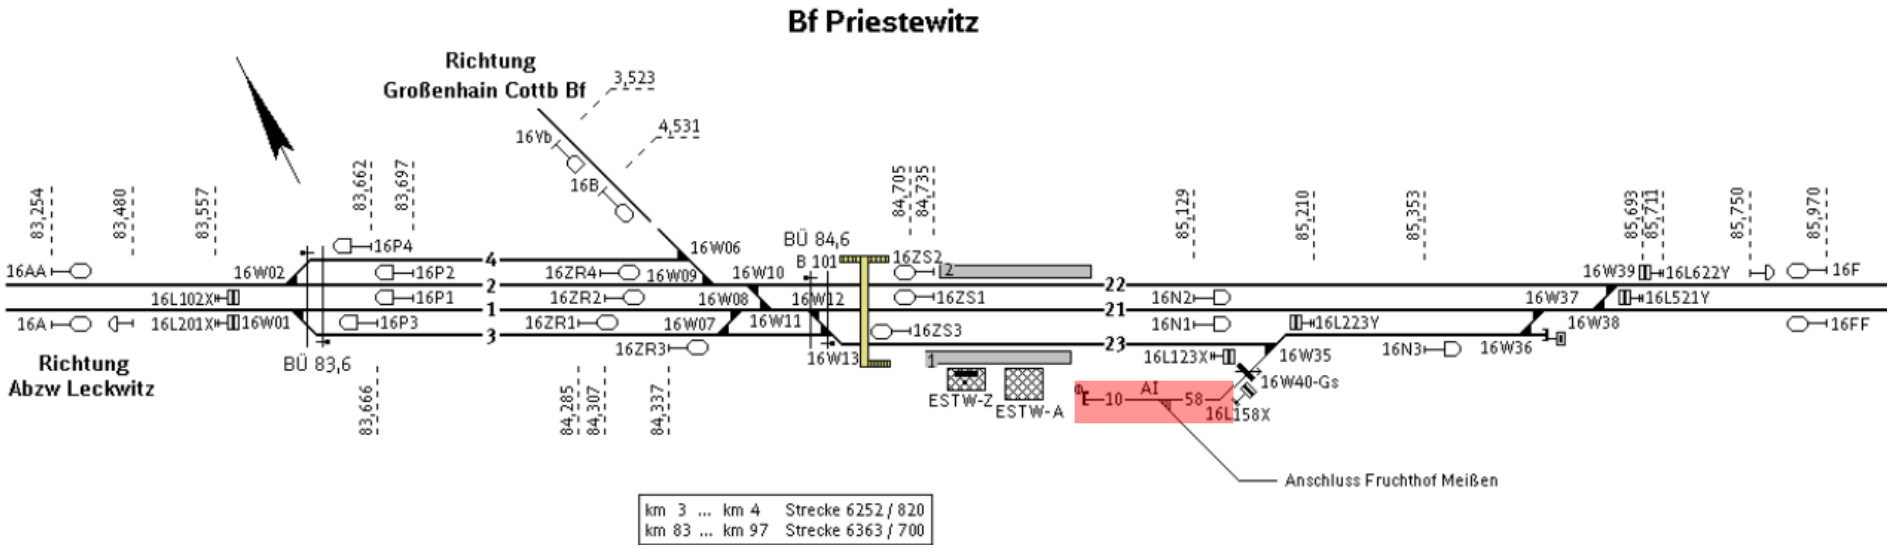

**Rote Darstellung 18.05.27 22:00 Uhr – 21.05.27 04:00 Uhr, 54h,** Sg 17, WE W35

**Blaue Darstellung 18./19.05. – 20./21.05.27 jeweils 22:00 Uhr - 04:00 Uhr**, Sg 3, 401, 7 Aufbau feste Absperrung an Gl. 21 ca. 400, Einbau Schutz La 90, Ausbau feste Absperrung, Schwellenwechsel zwischen W 35 - 36

**19.05.27 04:00 Uhr – 20.05.27 22:00 Uhr Schutz La 90 im Gleis 21 km 85,1 - 85,5**

**Gelbe Darstellung stromloser Bereich in nicht gesperrten Gleisen 18./19.05. – 20./21.05.27 jeweils 22:00 Uhr - 04:00 Uhr**

