
DB InfraGO

DB InfraGO AG, Projekte Erfurt (V.II-SO-E-R)
Kurt-Schumacher-Str. 1, 99084 Erfurt

Strecke 6311 (Eisenach -Eisfeld)
Ersatzneubau EÜ Grabenbrücke, km 71,477

REISER+SCHLICHT Beratende Ingenieure
Schlachthofstr. 4, 99423 Weimar

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende
1	Gesamtdauer	Fre 05.02.27	Don 30.12.27
2	Planungsphase	Fre 05.02.27	Mit 05.05.27
3	Erstellung Ausführungsplanung	Fre 05.02.27	Mit 05.05.27
4	Beginn Ausführung Planungsleistungen AN	Fre 05.02.27	Fre 05.02.27
5	Vorlage AP KIB und Oberbau zur Prüfung	Mit 05.05.27	Mit 05.05.27
6	Vorlaufmaßnahmen LBP	Fre 05.02.27	Die 01.06.27
7	**Ausführungsphase**	**Die 01.06.27**	**Mon 16.08.27**
8	Beginn der Ausführung auf der Baustelle	Die 01.06.27	Die 01.06.27
9	Baustelleneinrichtung, vorbereitende Maßmahmen	Die 01.06.27	Don 17.06.27
10	**Arbeiten vor der Sperrpause**	**Don 17.06.27**	**Fre 16.07.27**
11	Vorarbeiten Kabelumverlegung, Kabelhilfsbrücke, Gewässerbau	Don 17.06.27	Fre 16.07.27
12	**Arbeiten in der Sperrpause**	**Sam 17.07.27**	**Mon 02.08.27**
13	Arbeiten in der Sperrpause 17.07.27-02.08.27 2-Schichtbetrieb, 6t/Woche	Sam 17.07.27	Mon 02.08.27
14	Fertigstellung + IBN Bauwerk	Mon 02.08.27	Mon 02.08.27
15	**Arbeiten nach der Sperrpause**	**Die 03.08.27**	**Sam 27.11.27**
16	Einbau Gewässersohle vor und hinter BW, Gewässerbau, Wegebau, Rückbau Baubehelfe	Die 03.08.27	Mon 16.08.27
17	Rückbau BE	Mon 16.08.27	Fre 20.08.27
18	Belastungsstopfgang (Zugpausen)	Fre 26.11.27	Sam 27.11.27
19	Übergabe der vollständigen Bestandsunterlagen	Fre 31.12.27	Fre 31.12.27
20	Fertigstellung aller Leistungen auf der Baustelle	Fre 31.12.27	Fre 31.12.27

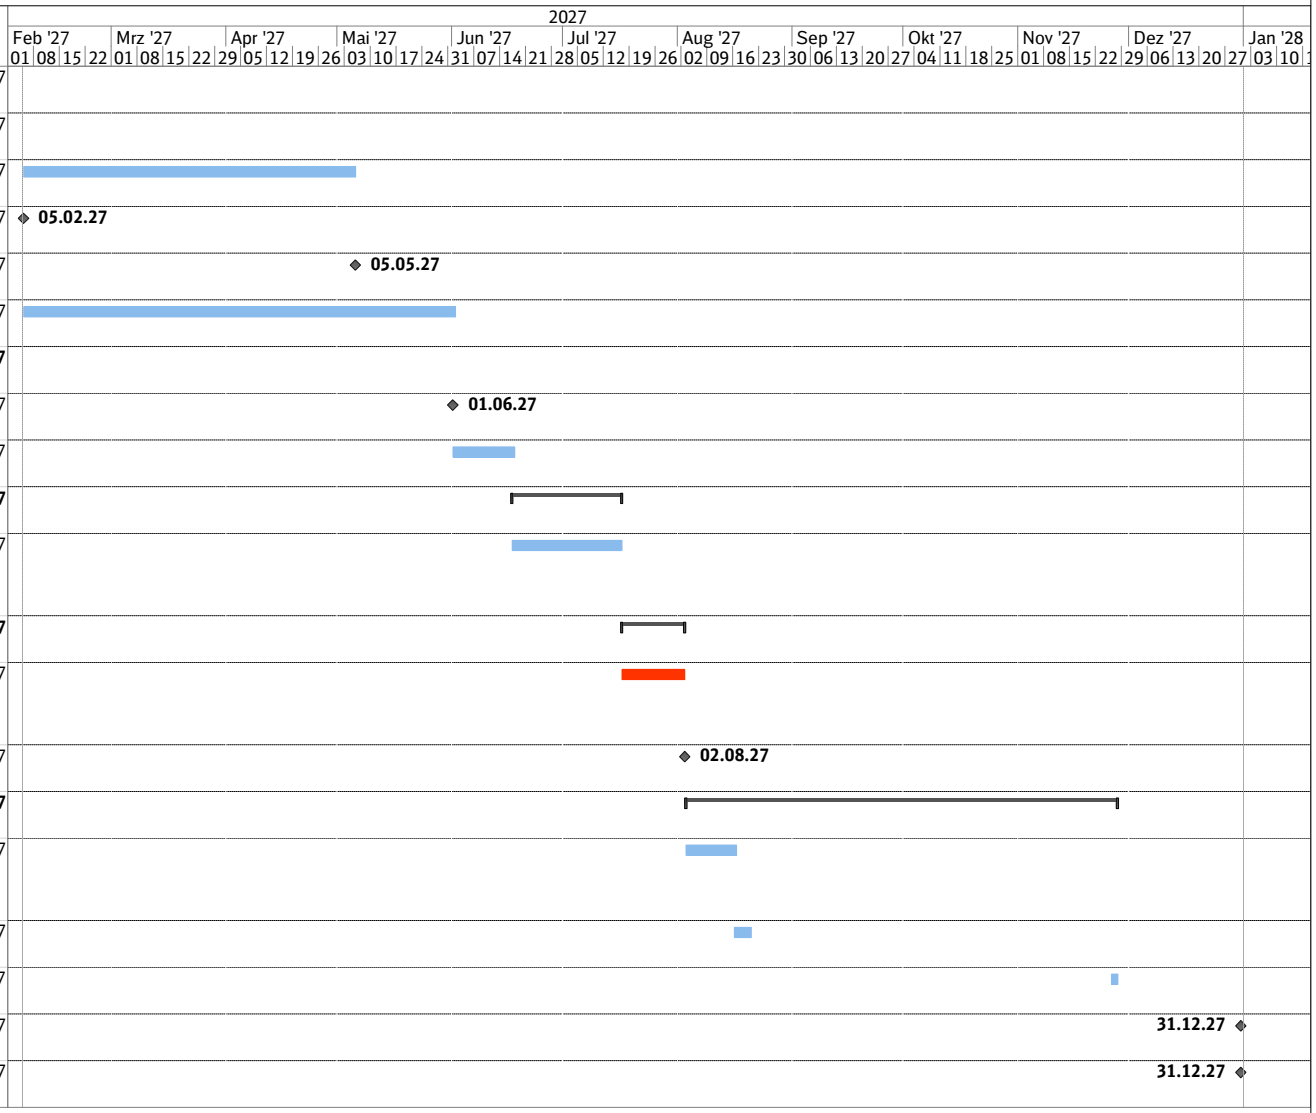

Projekt: Rahmenterminplan_ge
Datum: Die 18.08.26

Vorgang | Vertragstermin | Sammelvorgang | Gesamtdauer | Sperrpause
