

Stuttgart Ost (TSO), Weiche 707, 730, und Gleis 702 | Weichenerneuerung (WE + RB/LS), Gleiserneuerung (GE)**Hauptarbeiten zur Gleiserneuerung Gleis 702 und Rb/Ls Weiche 730 und Weichenerneuerung Weiche 707:**

Sperrung Stuttgart Ost (TSO), Weiche 731, 732 und Weiche 733 von Sig "F733" bis "Pb(Gl.731)":

- Sa. 27.02.27, 09:00 Uhr - Mo. 08.03.27, 09:00 Uhr, durchgehend (Sp Ngl: 216h) | Aussch. OL: "keine"

Sperrung Stuttgart Ost (TSO), Gleis 702 von "Ra12 W731" bis "Pb(Gl.731)":

- Mo. 08.03.27, 09:00 Uhr - Mo. 15.03.27, 09:00 Uhr, durchgehend (Sp Ngl: 168h) | Aussch. OL: "keine"

Sperrung Stuttgart Ost (TSO), Gleis 701 von Sig "F733" bis "Pb(Gl.731)":

- Mo. 08.03.27 - Mo. 15.03.27, jeweils 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr und 18:00 Uhr bis 09:00, durchgehend (Sp Ngl: 154h) | Aussch. OL: "keine"

Vorarbeiten und Montagearbeiten zur Weichenerneuerung:

Stuttgart Ost (TSO), Gleis 701 und Gleis 702 von "Ra12 W731" bis "Pb(Gl.731)":

- Mo. 15.02.27, 07:00 Uhr - Fr. 26.02.27, 16:00 Uhr, durchgehend (Sp Ngl: 273h) | Aussch. OL: "keine"

(Hinweis 1: Montage Weichengroßteile und Anschlüsse auf Gleis 702 | Logistik für Montage aus Gleis 701)

(Hinweis 2: Bedienung Kai A über Gleis 701, täglich Mo.-Fr., 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr und 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr)

Nacharbeiten und Restarbeiten zur Oberbaumaßnahme:

Stuttgart Ost (TSO), Gleis 701 und Gleis 702 von "Ra12 W731" bis "Pb(Gl.731)":

- Mo. 15.03.27, 07:00 Uhr - Fr. 19.03.27, 16:00 Uhr, durchgehend (Sp Ngl: 105h) | Aussch. OL: "keine"

(Hinweis: Bedienung "Kai A" über Gleis 701, täglich Mo.-Fr., 09:00 Uhr - 10:00 Uhr und 17:00 Uhr - 18:00 Uhr)

Teilleistungen im Projekt 27 Stuttgart-Ost:

(Ausführung einer konventionellen Weichen- und Gleiserneuerung mit Rückbau und Lückenschluss)

Stuttgart Ost (TSO), Weiche 707


Stuttgart Ost (TSO), Weiche 730

Stuttgart Ost (TSO), Gleis 702

Infrastrukturanschluss (IAV) Stuttgart Hafen GmbH:

- Andienung "Kai A" im Zeitraum Sa. 27.02.27, 09:00 Uhr bis Mo. 08.03.2027, 09:00 Uhr (216h) nicht möglich

- Andienung "Kai A" über Gleis 701 in Abstimmung mit Baustelle tägl. im Zeitraum Mo. 08.03.27 bis Mo. 15.03.27, tägl. 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr und 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr

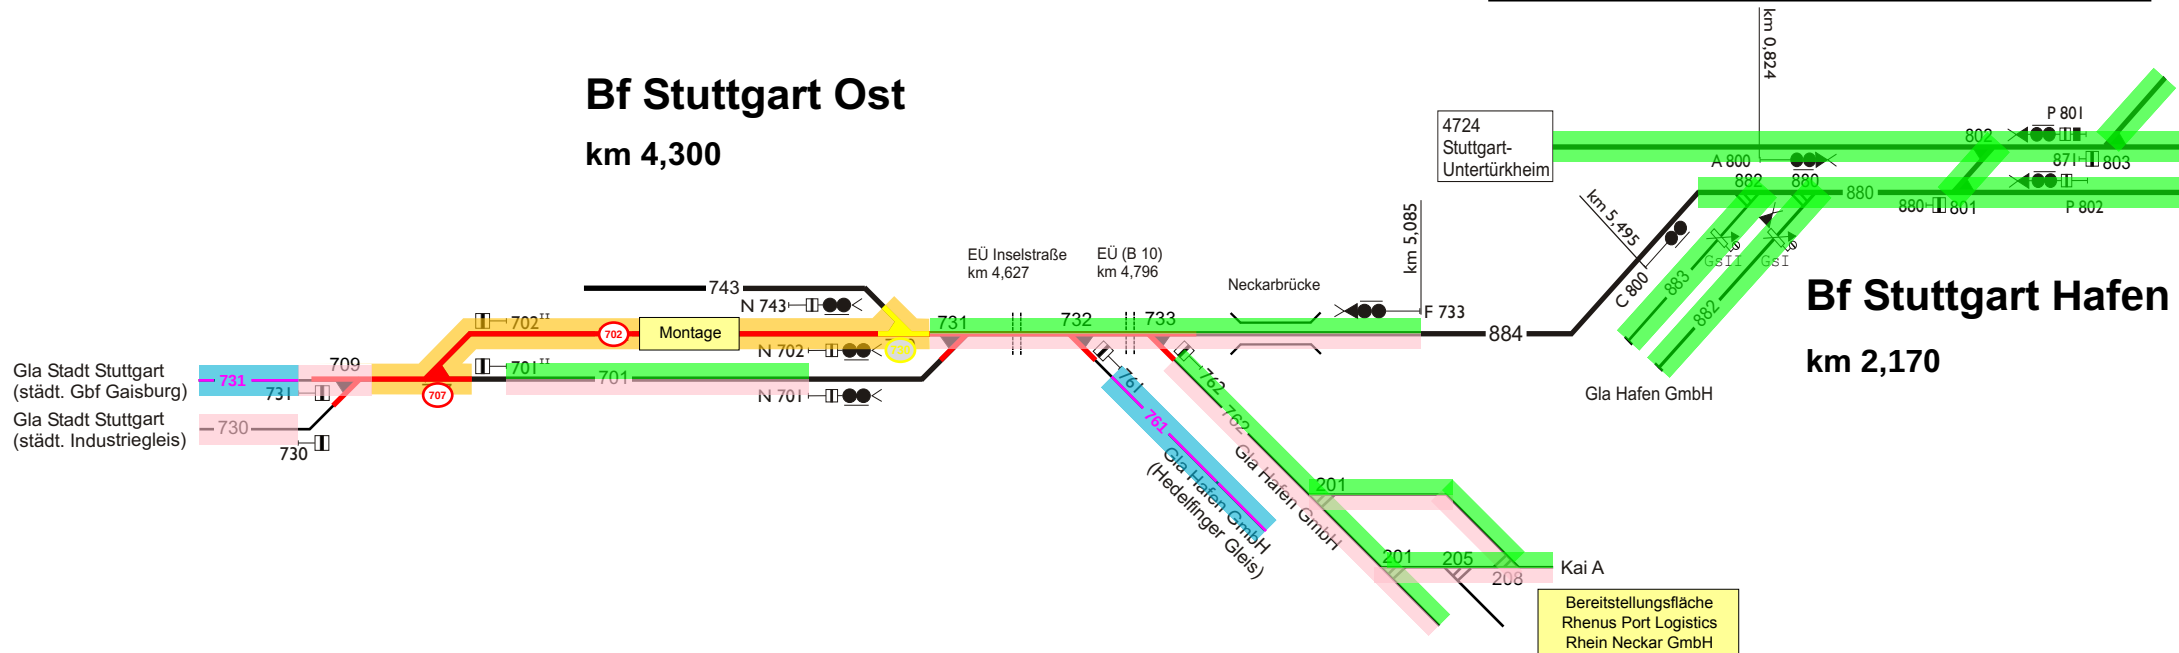

Logistikgleise:

Übergabegleise:

Bereitstellungsfläche:

Stuttgart Hafen (TSH), Gleis 101, 103, 731 und Gleis 761

Stuttgart Hafen (TSH), Gleis 806 und Gleis 807

Stuttgart Hafen (TSH), Fläche am Gleis 202 (Kai A)

(Mo. 15.02.27 - Fr. 19.03.27)

(Mo. 15.02.27 - Fr. 19.03.27)

(Mo. 15.02.27 - Fr. 19.03.27)

(KKM2027 | Anmeldung-258276)

Stand: 01.06.2026 | (Version 01)



spettmannkahr
INGENIEURBÜRO
